

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	\$ 16,020,926.34	\$ 8,364,130.87	\$ 8,165,064.49
Modificado	\$ 59,507,684.55	\$ 8,558,191.63	\$ 6,485,345.82
Devengado	\$ 17,159,009.38	\$ 14,339,618.20	\$ 15,375,396.43

1er Trim
\$ 32,550,121.70
\$ 74,551,222.00
\$ 46,874,024.01

Semáforo		
A	129.04%	Fallo en la planeación
B	62.87%	

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	\$ 8,089,422.39	\$ 8,093,181.95	\$ 8,221,054.30
Modificado	\$ 8,382,179.04	\$ 8,438,507.99	\$ 9,521,493.33
Devengado	\$ 3,309,296.66	\$ 2,294,240.35	\$ 2,635,424.54

2do Trim
\$ 24,403,658.64
\$ 26,342,180.36
\$ 8,238,961.55

Semáforo		
A	7.94%	Aceptable
B	31.28%	

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	\$ 8,202,114.56	\$ 8,089,597.61	\$ 8,126,233.50
Modificado	\$ 10,520,078.21	\$ 8,425,503.72	\$ 8,550,663.89
Devengado	\$ 2,342,885.52	\$ 2,303,882.41	\$ 2,208,343.22

3er Trim
\$ 24,417,945.67
\$ 27,496,245.82
\$ 6,855,111.15

Semáforo	
A	12.61%
B	24.93%

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	\$ 2,520,038.86	\$ 362,869.28	\$ 7,425,504.04
Modificado	\$ 2,072,847.34	\$ 547,269.95	\$ 85,652.61
Devengado	\$ 1,392,805.43	\$ 1,863,869.44	\$ 23,600,047.52

4to Trim
\$ 10,308,412.18
\$ 2,534,464.68
\$ 26,856,722.39

Semáforo	
A	-75.41% Fallo en la planeación
B	1059.66%

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
41 - 60	Crítico	●
21 - 40	En riesgo	●
0 - 20	Aceptable	●
más de 61	Fallo en la planeación	●

Acumulado al periodo		
Momentos Contables	Total	Semáforo
Aprobado	\$ 91,680,138.19	A 42.81% Crítico
Modificado	\$ 130,924,112.86	
Devengado	\$ 88,824,819.10	
		B 67.84%

Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado

B. Porcentaje de avance del Modificado contra el Devengado

Acumulado Anual		
Momentos Contables	Total	
Aprobado	\$ 91,680,138.19	
Modificado	\$ 130,924,112.86	
Devengado	\$ 88,824,819.10	



Arq. Alberto Kanek Zagal González
Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

Arq. Alberto Gutiérrez Limón
Coordinador Técnico de la Secretaría de
Desarrollo Urbano y Obras Públicas

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

OP201

Obras y Servicios Públicos Competitivos

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	\$ 1,284,107.25	\$ 421,065.06	\$ 367,465.06
Modificado	\$ 884,624.96	\$ 547,096.03	\$ 437,276.44
Devengado	\$ 407,847.50	\$ 415,935.31	\$ 586,379.53

1er Trim
\$ 2,072,637.37
\$ 1,868,997.43
\$ 1,410,162.34

Semáforo
A -9.83%
B 75.45%
Acceptable

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	\$ 364,365.06	\$ 376,965.06	\$ 378,665.06
Modificado	\$ 554,666.60	\$ 638,730.26	\$ 531,177.71
Devengado	\$ 600,905.21	\$ 616,294.06	\$ 598,042.57

2do Trim
\$ 1,119,995.18
\$ 1,724,574.57
\$ 1,815,241.84

Semáforo
A 53.98%
B 105.26%
Crítico

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	\$ 374,465.06	\$ 356,165.06	\$ 361,465.06
Modificado	\$ 677,031.34	\$ 592,572.65	\$ 578,797.72
Devengado	-\$ 101,313.49	\$ 546,359.14	\$ 526,498.63

3er Trim
\$ 1,092,095.18
\$ 1,848,401.71
\$ 971,544.28

Semáforo
A 69.25%
B 52.56%
Fallo en la planeación

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	\$ 351,165.06	\$ 137,100.00	\$ 862,900.00
Modificado	\$ 64,661.90	\$ 188,361.34	-\$ 659,596.68
Devengado	\$ 164,834.89	\$ 167,233.07	\$ 301,992.76

4to Trim
\$ 1,351,165.06
-\$ 406,573.44
\$ 634,060.72

Semáforo
A -130.09%
B -155.95%
Fallo en la planeación

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
41 - 60	Crítico	●
21 - 40	En riesgo	●
0 - 20	Aceptable	●
más de 61	Fallo en la planeación	●

Acumulado al Periodo	Total
Aprobado	\$ 5,635,892.79
Modificado	\$ 5,035,400.27
Devengado	\$ 4,831,009.18


Semáforo
A -10.65%
B 95.94%
Acceptable

Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado

B. Porcentaje de avance del Modificado contra el Devengado


Arq. Alberto Kanek Zagal González
Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas


Arq. Alberto Gutiérrez Limón
Coordinador Técnico de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

SP202

Bienes Muebles Fortaseg

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

1er Trim
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo
A
B

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

2do Trim
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo
A
B

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

3er Trim
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo
A
B

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

4to Trim
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo
A
B


Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
41 - 60	Crítico	●
21 - 40	En riesgo	●
0 - 20	Aceptable	●
más de 61	Fallo en la planeación	●


Acumulado al Periodo	Total
Aprobado	\$ -
Modificado	\$ -
Devengado	\$ -

Semáforo
A
B

Comentarios:

- A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado
- B. Porcentaje de avance del Modificado contra el Devengado


Arq. Alberto Kanek Zagal González
Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas


Arq. Alberto Gutiérrez Limón
Coordinador Técnico de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

OP203

Obras Públicas de Calidad

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	\$ 1,168,456.60	\$ 634,040.78	\$ 595,540.78
Modificado	\$ 1,132,719.57	\$ 649,806.67	\$ 564,155.28
Devengado	\$ 533,646.14	\$ 537,064.31	\$ 489,151.40

1er Trim
\$ 2,398,038.16
\$ 2,346,681.52
\$ 1,559,861.85

Semáforo
A -2.14%
B 66.47%
Acceptable

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	\$ 576,040.78	\$ 560,040.78	\$ 635,040.78
Modificado	\$ 611,732.21	\$ 580,998.94	\$ 440,063.39
Devengado	\$ 530,965.25	\$ 534,646.23	\$ 515,694.11

2do Trim
\$ 1,771,122.34
\$ 1,632,794.54
\$ 1,581,305.59

Semáforo
A -7.81%
B 96.85%
Acceptable

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	\$ 579,040.78	\$ 590,040.78	\$ 594,040.78
Modificado	\$ 676,065.01	\$ 608,629.36	\$ 675,242.32
Devengado	\$ 153,084.14	\$ 550,646.36	\$ 524,362.76

3er Trim
\$ 1,763,122.34
\$ 1,959,936.69
\$ 1,228,093.26

Semáforo
A 11.16%
B 62.66%
Acceptable

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	\$ 565,040.78	\$ 122,800.00	\$ 1,898,040.80
Modificado	\$ 545,879.06	\$ 135,790.33	\$ 318,089.12
Devengado	\$ 306,611.00	\$ 360,888.38	\$ 1,023,808.61

4to Trim
\$ 2,585,881.58
\$ 363,580.27
\$ 1,691,307.99

Semáforo
A -85.94%
B 465.18%
Fallo en la planeación

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
41 - 60	Crítico	●
21 - 40	En riesgo	●
0 - 20	Acceptable	●
más de 61	Fallo en la planeación	●


Acumulado al Periodo	Total
Aprobado	\$ 8,518,164.42
Modificado	\$ 6,302,993.02
Devengado	\$ 6,060,568.69

Semáforo
A -26.01%
B 96.15%
En riesgo

Comentarios:

- A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado
- B. Porcentaje de avance del Modificado contra el Devengado


Arq. Alberto Kanek Zagal González
Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas


Arq. Alberto Gutiérrez Limón
Coordinador Técnico de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

OP204

Obras por Autogestión

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	\$ 5,000,000.00	\$ -	\$ -
Modificado	\$ 5,000,000.00	\$ -	\$ -2,383,722.52
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -

1er Trim
\$ 5,000,000.00
\$ 2,616,277.48
\$ -

Semáforo
A -47.67%
B 0.00%
Crítico

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -

2do Trim
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo
A 0.00%
B 0.00%
Aceptable

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -

3er Trim
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo
A 0.00%
B 0.00%
Aceptable

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -

4to Trim
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo
A 0.00%
B 0.00%
Aceptable

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
41 - 60	Crítico	●
21 - 40	En riesgo	●
0 - 20	Aceptable	●
más de 61	Fallo en la planeación	●


Acumulado al Periodo	Total
Aprobado	\$ 5,000,000.00
Modificado	\$ 2,616,277.48
Devengado	\$ -


Semáforo
A -47.67%
B 0.00%
Crítico

Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado

B. Porcentaje de avance del Modificado contra el Devengado


Arq. Alberto Kanek Zagal González
Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas


Arq. Alberto Gutiérrez Limón
Coordinador Técnico de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

OP205

Ramo General 33, Fondo III - 2019

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	\$ 5,780,538.74	\$ 5,780,538.74	\$ 5,780,538.74
Modificado	\$ 8,598,153.52	\$ 5,780,538.74	\$ 4,419,499.73
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -

1er Trim
\$ 17,341,616.22
\$ 18,798,191.99
\$ -

Semáforo
A 8.40%
B 0.00%
Acceptable

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	\$ 5,780,538.74	\$ 5,780,538.74	\$ 5,780,538.74
Modificado	\$ 5,780,538.74	\$ 5,788,291.42	\$ 5,784,931.65
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -

2do Trim
\$ 17,341,616.22
\$ 17,353,761.81
\$ -

Semáforo
A 0.07%
B 0.00%
Acceptable

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	\$ 5,780,538.74	\$ 5,780,538.74	\$ 5,780,538.74
Modificado	\$ 5,782,402.09	\$ 5,787,572.65	-\$ 32,591,748.68
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -

3er Trim
\$ 17,341,616.22
-\$ 21,021,773.94
\$ -

Semáforo
A -221.22%
B 0.00%
Fallo en la planeación

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	\$ 225,503.56	\$ -	\$ -
Modificado	-\$ 15,089,636.09	\$ 11,932.15	\$ 81,727.54
Devengado	\$ -	\$ -	\$ 108,763.11

4to Trim
\$ 225,503.56
-\$ 14,995,976.40
\$ 108,763.11

Semáforo
A -6750.00%
B -0.73%
#N/D

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
41 - 60	Crítico	●
21 - 40	En riesgo	●
0 - 20	Aceptable	●
más de 61	Fallo en la planeación	●


Acumulado al Periodo	Total
Aprobado	\$ 52,250,352.22
Modificado	\$ 134,203.46
Devengado	\$ 108,763.11

Semáforo
A -99.74%
B 81.04%
Fallo en la planeación


Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado

B. Porcentaje de avance del Modificado contra el Devengado



Arq. Alberto Kanek Zagal González
Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas



Arq. Alberto Gutiérrez Limón
Coordinador Técnico de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

OP206

Proyectos de Obra

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	\$ 692,500.00	\$ 379,112.87	\$ 335,359.91
Modificado	\$ 729,100.00	\$ 417,469.71	\$ 375,153.65
Devengado	\$ 347,811.51	\$ 343,154.56	\$ 336,913.97

1er Trim
\$ 1,406,972.78
\$ 1,521,723.36
\$ 1,027,880.04

Semáforo
A 8.16%
B 67.55%
Acceptable

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	\$ 326,659.91	\$ 330,759.91	\$ 344,659.91
Modificado	\$ 371,258.55	\$ 377,159.91	\$ 343,382.13
Devengado	\$ 371,743.36	\$ 349,289.40	\$ 348,086.93

2do Trim
\$ 1,002,079.73
\$ 1,091,800.59
\$ 1,069,119.69

Semáforo
A 8.95%
B 97.92%
Acceptable

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	\$ 340,759.91	\$ 326,659.91	\$ 344,044.91
Modificado	\$ 389,335.58	\$ 343,115.57	\$ 376,121.96
Devengado	\$ 59,821.98	\$ 291,016.77	\$ 261,481.29

3er Trim
\$ 1,011,464.73
\$ 1,108,573.11
\$ 612,320.04

Semáforo
A 9.60%
B 55.23%
Acceptable

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	\$ 340,828.58	\$ 23,500.00	\$ 1,184,253.85
Modificado	-\$ 532,404.81	\$ -	-\$ 344,353.42
Devengado	\$ 40,379.27	\$ 44,908.92	\$ -

4to Trim
\$ 1,548,582.43
-\$ 876,758.23
\$ 85,288.19

Semáforo
A -156.62%
B -9.73%
Fallo en la planeación

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
41 - 60	Crítico	●
21 - 40	En riesgo	●
0 - 20	Aceptable	●
más de 61	Fallo en la planeación	●


Acumulado al Periodo	Total
Aprobado	\$ 4,969,099.67
Modificado	\$ 2,845,338.83
Devengado	\$ 2,794,607.96

Semáforo
A -42.74%
B 98.22%
Crítico


Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado

B. Porcentaje de avance del Modificado contra el Devengado



Arq. Alberto Kanek Zagal González
Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

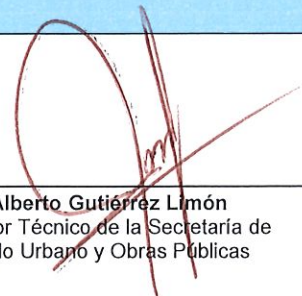

Arq. Alberto Gutiérrez Limón
Coordinador Técnico de la Secretaría de
Desarrollo Urbano y Obras Públicas

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

OP207

Inspección y Licencias

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	\$ 2,095,200.00	\$ 1,149,373.42	\$ 1,086,160.00
Modificado	\$ 2,092,807.11	\$ 1,163,280.48	\$ 1,108,817.55
Devengado	\$ 959,897.20	\$ 1,044,378.69	\$ 807,352.11

1er Trim
\$ 4,330,733.42
\$ 4,364,905.14
\$ 2,811,628.00

Semáforo
A 0.79%
B 64.41%
Acceptable

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	\$ 1,041,817.90	\$ 1,044,877.46	\$ 1,082,149.81
Modificado	\$ 1,055,483.14	\$ 1,053,327.46	\$ 1,060,899.44
Devengado	\$ 791,450.43	\$ 794,010.66	\$ 775,585.49

2do Trim
\$ 3,168,845.17
\$ 3,169,710.04
\$ 2,361,046.58

Semáforo
A 0.03%
B 74.49%
Acceptable

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	\$ 1,127,310.07	\$ 1,036,193.12	\$ 1,046,144.01
Modificado	\$ 1,242,293.26	\$ 1,093,613.49	\$ 1,078,829.06
Devengado	\$ 360,990.91	\$ 814,924.18	\$ 743,194.85

3er Trim
\$ 3,209,647.20
\$ 3,414,735.81
\$ 1,919,109.94

Semáforo
A 6.39%
B 56.20%
Acceptable

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	\$ 1,037,500.88	\$ 79,469.28	\$ 3,480,309.39
Modificado	-\$ 2,578,576.00	\$ 20,277.48	-\$ 751,571.58
Devengado	\$ 27,197.15	\$ 140,689.46	\$ -

4to Trim
\$ 4,597,279.55
-\$ 3,309,870.10
\$ 167,886.61

Semáforo
A -172.00%
B -5.07%
Fallo en la planeación

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
41 - 60	Crítico	●
21 - 40	En riesgo	●
0 - 20	Acceptable	●
más de 61	Fallo en la planeación	●

Acumulado al Periodo	Total
Aprobado	\$ 15,306,505.34
Modificado	\$ 7,639,480.89
Devengado	\$ 7,259,671.13


Semáforo
A -50.09%
B 95.03%
Crítico

Comentarios:

- A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado
- B. Porcentaje de avance del Modificado contra el Devengado



Arq. Alberto Kanek Zagal González
Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas



Arq. Alberto Gutiérrez Limón
Coordinador Técnico de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

OP208

Pinta tu barrio

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

1er Trim
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo
A
B

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

2do Trim
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo
A
B

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

3er Trim
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo
A
B

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

4to Trim
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo
A
B

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
41 - 60	Crítico	●
21 - 40	En riesgo	●
0 - 20	Aceptable	●
más de 61	Fallo en la planeación	●

Acumulado al Periodo	Total
Aprobado	\$ -
Modificado	\$ -
Devengado	\$ -


Semáforo
A
B

Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado

B. Porcentaje de avance del Modificado contra el Devengado


Arq. Alberto Kanek Zagal González
Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas


Arq. Alberto Gutiérrez Limón
Coordinador Técnico de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

OP209

Restauración Integral Catedral Cuernavaca

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	\$ 123.75	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -

1er Trim
\$ 123.75
\$ -
\$ -

Semáforo
A -100.00% Fallo en la planeación
B 0.00%

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -

2do Trim
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo
A 0.00% Aceptable
B 0.00%

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -

3er Trim
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo
A 0.00% Aceptable
B 0.00%

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -

4to Trim
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo
A 0.00% Aceptable
B 0.00%

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
41 - 60	Crítico	●
21 - 40	En riesgo	●
0 - 20	Aceptable	●
más de 61	Fallo en la planeación	●


Acumulado al Periodo	Total
Aprobado	\$ 123.75
Modificado	\$ -
Devengado	\$ -

Semáforo
A -100.00% Fallo en la planeación
B 0.00%


Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado

B. Porcentaje de avance del Modificado contra el Devengado



Arq. Alberto Kanek Zagal González
Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas



Arq. Alberto Gutiérrez Limón
Coordinador Técnico de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

OP210

Sentencias y Resoluciones por autoridades competentes

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ 72,999.38	\$ -	\$ -
Devengado	\$ 72,999.38	\$ -	\$ -

1er Trim
\$ -
\$ 72,999.38
\$ 72,999.38

Semáforo	
A	0.00%
B	100.00%
Aceptable	

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -

2do Trim
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo	
A	0.00%
B	0.00%
Aceptable	

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ 51,869.73
Devengado	\$ -	\$ -	\$ 51,869.73

3er Trim
\$ -
\$ 51,869.73
\$ 51,869.73

Semáforo	
A	0.00%
B	100.00%
Aceptable	

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -

4to Trim
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo	
A	0.00%
B	0.00%
Aceptable	

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
41 - 60	Crítico	●
21 - 40	En riesgo	●
0 - 20	Aceptable	●
más de 61	Fallo en la planeación	●


Acumulado al Periodo	Total
Aprobado	\$ -
Modificado	\$ 124,869.11
Devengado	\$ 124,869.11

Semáforo	
A	0.00%
B	100.00%
Aceptable	


Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado

B. Porcentaje de avance del Modificado contra el Devengado



Arq. Alberto Kanek Zagal González
Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

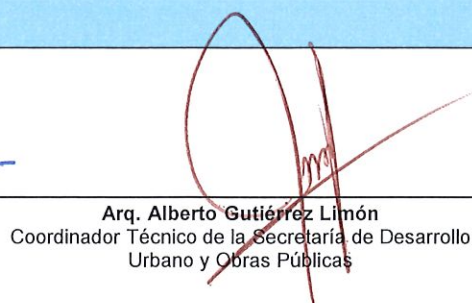

Arq. Alberto Gutiérrez Limón
Coordinador Técnico de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

OP211

Rehabilitación de techumbre e instalaciones de la Unidad Deportiva "Gloria Almada de Bejarano" perteneciente al Municipio de Cuernavaca, Morelos

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ 55.00	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -

1er Trim
\$ -
\$ 55.00
\$ -

Semáforo	
A	0.00% Aceptable
B	0.00%

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -

2do Trim
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo	
A	0.00% Aceptable
B	0.00%

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -

3er Trim
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo	
A	0.00% Aceptable
B	0.00%

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -

4to Trim
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo	
A	0.00% Aceptable
B	0.00%

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
41 - 60	Crítico	●
21 - 40	En riesgo	●
0 - 20	Aceptable	●
más de 61	Fallo en la planeación	●


Acumulado al Periodo	Total
Aprobado	\$ -
Modificado	\$ 55.00
Devengado	\$ -

Semáforo	
A	0.00% Aceptable
B	0.00%


Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado

B. Porcentaje de avance del Modificado contra el Devengado



Arq. Alberto Kanek Zagal González
Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas



Arq. Alberto Gutiérrez Limón
Coordinador Técnico de la Secretaría de
Desarrollo Urbano y Obras Públicas

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

OP213

Pavimento de concreto hidráulico en Privada Libertad

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ 514,785.25
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -

1er Trim
\$ -
\$ 514,785.25
\$ -

Semáforo
A 0.00%
B 0.00%
Aceptable

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -

2do Trim
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo
A 0.00%
B 0.00%
Aceptable

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -

3er Trim
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo
A 0.00%
B 0.00%
Aceptable

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -

4to Trim
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo
A 0.00%
B 0.00%
Aceptable

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
41 - 60	Crítico	●
21 - 40	En riesgo	●
0 - 20	Aceptable	●
más de 61	Fallo en la planeación	●


Acumulado al Periodo	Total
Aprobado	\$ -
Modificado	\$ 514,785.25
Devengado	\$ -


Semáforo
A 0.00%
B 0.00%
Aceptable

Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado

B. Porcentaje de avance del Modificado contra el Devengado


Arq. Alberto Kanek Zagal González
Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas


Arq. Alberto Gutiérrez Limón
Coordinador Técnico de la Secretaría de
Desarrollo Urbano y Obras Públicas

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

OP214

Pavimento de concreto hidráulico en Privada Puebla

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

1er Trim
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo
A
B

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

2do Trim
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo
A
B

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

3er Trim
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo
A
B

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

4to Trim
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo
A
B

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
41 - 60	Crítico	●
21 - 40	En riesgo	●
0 - 20	Aceptable	●
más de 61	Fallo en la planeación	●


Acumulado al Periodo	Total
Aprobado	\$ -
Modificado	\$ -
Devengado	\$ -


Semáforo
A
B

Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado

B. Porcentaje de avance del Modificado contra el Devengado


Arq. Alberto Kanek Zagal González
Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas


Arq. Alberto Gutiérrez Limón
Coordinador Técnico de la Secretaría de
Desarrollo Urbano y Obras Públicas

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

OP215

Pavimento de concreto hidráulico en 2a Privada Begonia

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ 115,213.85
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -

1er Trim
\$ -
\$ 115,213.85
\$ -

Semáforo
A 0.00%
B 0.00%
Aceptable

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -

2do Trim
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo
A 0.00%
B 0.00%
Aceptable

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -

3er Trim
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo
A 0.00%
B 0.00%
Aceptable

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -

4to Trim
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo
A 0.00%
B 0.00%
Aceptable

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
41 - 60	Crítico	●
21 - 40	En riesgo	●
0 - 20	Aceptable	●
más de 61	Fallo en la planeación	●


Acumulado al Periodo	Total
Aprobado	\$ -
Modificado	\$ 115,213.85
Devengado	\$ -


Semáforo
A 0.00%
B 0.00%
Aceptable

Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado

B. Porcentaje de avance del Modificado contra el Devengado


Arq. Alberto Kanek Zagal González
Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas


Arq. Alberto Gutiérrez Limón
Coordinador Técnico de la Secretaría de
Desarrollo Urbano y Obras Públicas

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

OP216

Pavimento de concreto hidráulico en Prolongación Begonia

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ 73,540.75
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -

1er Trim
\$ -
\$ 73,540.75
\$ -

Semáforo
A 0.00%
B 0.00%
Acceptable

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -

2do Trim
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo
A 0.00%
B 0.00%
Acceptable

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -

3er Trim
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo
A 0.00%
B 0.00%
Acceptable

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -

4to Trim
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo
A 0.00%
B 0.00%
Acceptable

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
41 - 60	Crítico	●
21 - 40	En riesgo	●
0 - 20	Aceptable	●
más de 61	Fallo en la planeación	●


Acumulado al Periodo	Total
Aprobado	\$ -
Modificado	\$ 73,540.75
Devengado	\$ -

Semáforo
A 0.00%
B 0.00%
Acceptable


Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado

B. Porcentaje de avance del Modificado contra el Devengado



Arq. Alberto Kanek Zagal González
Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas



Arq. Alberto Gutiérrez Limón
Coordinador Técnico de la Secretaría de
Desarrollo Urbano y Obras Públicas

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

OP217

Pavimento de concreto hidráulico en Calle Bugambilia

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ 1,260,625.84
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -

1er Trim
\$ -
\$ 1,260,625.84
\$ -

Semáforo	
A	0.00%
B	0.00%
Aceptable	

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -

2do Trim
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo	
A	0.00%
B	0.00%
Aceptable	

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -

3er Trim
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo	
A	0.00%
B	0.00%
Aceptable	

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -

4to Trim
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo	
A	0.00%
B	0.00%
Aceptable	

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
41 - 60	Crítico	●
21 - 40	En riesgo	●
0 - 20	Aceptable	●
más de 61	Fallo en la planeación	●


Acumulado al Periodo	Total
Aprobado	\$ -
Modificado	\$ 1,260,625.84
Devengado	\$ -

Semáforo	
A	0.00%
B	0.00%
Aceptable	


Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado

B. Porcentaje de avance del Modificado contra el Devengado



Arq. Alberto Kanek Zagal González
Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas



Arq. Alberto Gutiérrez Limón
Coordinador Técnico de la Secretaría de
Desarrollo Urbano y Obras Públicas

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

OP218

Indirectos Ramo 33 Fondo III - 2020

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

1er Trim
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo
A
B

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ 1,361,039.01
Devengado	\$ -	\$ -	\$ 398,015.44

2do Trim
\$ -
\$ 1,361,039.01
\$ 398,015.44

Semáforo
A 0.00%
B 29.24%

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ 117,351.05	\$ 100,935.96	\$ 100,935.96

3er Trim
\$ -
\$ -
\$ 319,222.97

Semáforo
A 0.00%
B 0.00%

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ 300,000.00	\$ -	\$ -
Devengado	\$ 164,225.28	\$ 302,051.30	\$ 477,524.02

4to Trim
\$ -
\$ 300,000.00
\$ 943,800.60

Semáforo
A 0.00%
B 314.60%

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
41 - 60	Crítico	●
21 - 40	En riesgo	●
0 - 20	Aceptable	●
más de 61	Fallo en la planeación	●


Acumulado al Periodo	Total
Aprobado	\$ -
Modificado	\$ 1,661,039.01
Devengado	\$ 1,661,039.01

Semáforo
A 0.00%
B 100.00%


Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado

B. Porcentaje de avance del Modificado contra el Devengado



Arq. Alberto Kanek Zagal González
Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas



Arq. Alberto Gutiérrez Limón
Coordinador Técnico de la Secretaría de
Desarrollo Urbano y Obras Públicas

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

OP219

Obras y Servicios Públicos Competitivos (Bansí, S.A.)

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

1er Trim
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo
A
B

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

2do Trim
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo
A
B

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ 598,228.06	\$ -	\$ -
Devengado	\$ 598,228.06	\$ -	\$ -

3er Trim
\$ -
\$ 598,228.06
\$ 598,228.06

Semáforo
A 0.00%
B 100.00%
Aceptable

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ 160,886.83
Devengado	\$ -	\$ -	\$ 160,886.83

4to Trim
\$ -
\$ 160,886.83
\$ 160,886.83

Semáforo
A 0.00%
B 100.00%
Aceptable

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
41 - 60	Crítico	●
21 - 40	En riesgo	●
0 - 20	Aceptable	●
más de 61	Fallo en la planeación	●


Acumulado al Periodo	Total
Aprobado	\$ -
Modificado	\$ 759,114.89
Devengado	\$ 759,114.89


Semáforo
A 0.00%
B 100.00%
Aceptable

Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado

B. Porcentaje de avance del Modificado contra el Devengado


Arq. Alberto Kanek Zagal González
Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

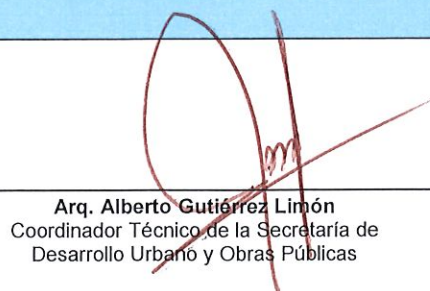
Arq. Alberto Gutiérrez Limón
Coordinador Técnico de la Secretaría de
Desarrollo Urbano y Obras Públicas

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

OP220

Obras Públicas de Calidad (Bansí, S.A.)

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

1er Trim
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo
A
B

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

2do Trim
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo
A
B

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ 374,220.52	\$ -	\$ -
Devengado	\$ 374,220.52	\$ -	\$ -

3er Trim
\$ -
\$ 374,220.52
\$ 374,220.52

Semáforo
A 0.00%
B 100.00%
Aceptable

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ 487,152.35
Devengado	\$ -	\$ -	\$ 487,152.35

4to Trim
\$ -
\$ 487,152.35
\$ 487,152.35

Semáforo
A 0.00%
B 100.00%
Aceptable

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
41 - 60	Crítico	●
21 - 40	En riesgo	●
0 - 20	Aceptable	●
más de 61	Fallo en la planeación	●


Acumulado al Periodo	Total
Aprobado	\$ -
Modificado	\$ 861,372.87
Devengado	\$ 861,372.87

Semáforo
A 0.00%
B 100.00%
Aceptable


Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado

B. Porcentaje de avance del Modificado contra el Devengado



Arq. Alberto Kanek Zagal González
Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas



Arq. Alberto Gutiérrez Limón
Coordinador Técnico de la Secretaría de
Desarrollo Urbano y Obras Públicas

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

OP221

Proyectos de Obra (Bansí, S.A.)

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

1er Trim
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo
A
B

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

2do Trim
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo
A
B

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ 267,843.81	\$ -	\$ -
Devengado	\$ 267,843.81	\$ -	\$ -

3er Trim
\$ -
\$ 267,843.81
\$ 267,843.81

Semáforo		
A	0.00%	Aceptable
B	100.00%	

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -

4to Trim
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo		
A	0.00%	Aceptable
B	0.00%	

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
41 - 60	Crítico	●
21 - 40	En riesgo	●
0 - 20	Aceptable	●
más de 61	Fallo en la planeación	●


Acumulado al Periodo	Total
Aprobado	\$ -
Modificado	\$ 267,843.81
Devengado	\$ 267,843.81

Semáforo		
A	0.00%	Aceptable
B	100.00%	


Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado

B. Porcentaje de avance del Modificado contra el Devengado



Arq. Alberto Kanek Zagal González
Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas



Arq. Alberto Gutiérrez Limón
Coordinador Técnico de la Secretaría de
Desarrollo Urbano y Obras Públicas

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

OP222

Inspecciones y Licencias (Bansí, S.A.)

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

1er Trim
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo
A
B

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

2do Trim
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo
A
B

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ 512,658.54	\$ -	\$ -
Devengado	\$ 512,658.54	\$ -	\$ -

3er Trim
\$ -
\$ 512,658.54
\$ 512,658.54

Semáforo
A
B

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -

4to Trim
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo
A
B

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
41 - 60	Crítico	●
21 - 40	En riesgo	●
0 - 20	Aceptable	●
más de 61	Fallo en la planeación	●


Acumulado al Periodo	Total
Aprobado	\$ -
Modificado	\$ 512,658.54
Devengado	\$ 512,658.54

Semáforo
A
B


Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado

B. Porcentaje de avance del Modificado contra el Devengado



Arq. Alberto Kanek Zagal González
Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas



Arq. Alberto Gutiérrez Limón
Coordinador Técnico de la Secretaría de
Desarrollo Urbano y Obras Públicas

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

OP223

Construcción de pavimentación en Cuernavaca, localidad Ocotepec en la calle Tres de Mayo

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

1er Trim
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo
A
B

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

2do Trim
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo
A
B

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ 2,316,282.54
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -

3er Trim
\$ -
\$ 2,316,282.54
\$ -

Semáforo
A 0.00%
B 0.00%
Aceptable

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ 168,907.28
Devengado	\$ -	\$ -	\$ 1,347,086.49

4to Trim
\$ -
\$ 168,907.28
\$ 1,347,086.49

Semáforo
A 0.00%
B 797.53%
Aceptable

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
41 - 60	Crítico	●
21 - 40	En riesgo	●
0 - 20	Aceptable	●
más de 61	Fallo en la planeación	●

Acumulado al Periodo	Total
Aprobado	\$ -
Modificado	\$ 2,485,189.82
Devengado	\$ 1,347,086.49

Semáforo
A 0.00%
B 54.20%
Aceptable


Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado

B. Porcentaje de avance del Modificado contra el Devengado



Arq. Alberto Kanek Zagal González
Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas



Arq. Alberto Gutiérrez Limón
Coordinador Técnico de la Secretaría de
Desarrollo Urbano y Obras Públicas

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

OP224

Construcción de techado en área de impartición de educación física en Cuernavaca, localidad Antonio Barona en la calle Azucena en el Jardín de Niños Julio Cáceres

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

1er Trim
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo
A
B

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

2do Trim
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo
A
B

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

3er Trim
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo
A
B

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

4to Trim
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo
A
B

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
41 - 60	Crítico	●
21 - 40	En riesgo	●
0 - 20	Aceptable	●
más de 61	Fallo en la planeación	●


Acumulado al Periodo	Total
Aprobado	\$ -
Modificado	\$ -
Devengado	\$ -

Semáforo		
A	0.00%	Aceptable
B	0.00%	


Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado

B. Porcentaje de avance del Modificado contra el Devengado



Arq. Alberto Kanek Zagal González
Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas



Arq. Alberto Gutiérrez Limón
Coordinador Técnico de la Secretaría de
Desarrollo Urbano y Obras Públicas

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

OP225

Construcción de pavimentación en Cuernavaca, localidad de Ahuatepec en la segunda privada de Bello Horizonte

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

1er Trim
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo
A
B

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

2do Trim
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo
A
B

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ 1,191,088.24
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -

3er Trim
\$ -
\$ 1,191,088.24
\$ -

Semáforo		
A	0.00%	Aceptable
B	0.00%	

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	-\$ 37,744.48
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -

4to Trim
\$ -
-\$ 37,744.48
\$ -

Semáforo		
A	0.00%	Aceptable
B	0.00%	

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
41 - 60	Crítico	●
21 - 40	En riesgo	●
0 - 20	Aceptable	●
más de 61	Fallo en la planeación	●

Acumulado al Periodo	Total
Aprobado	\$ -
Modificado	\$ 1,153,343.76
Devengado	\$ -


Semáforo		
A	0.00%	Aceptable
B	0.00%	

Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado

B. Porcentaje de avance del Modificado contra el Devengado


Arq. Alberto Kanek Zagal González
Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas


Arq. Alberto Gutiérrez Limón
Coordinador Técnico de la Secretaría de
Desarrollo Urbano y Obras Públicas

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

OP226

Construcción de pavimentación en Cuernavaca, localidad de lomas de Tzompantle en la calle Constelaciones

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

1er Trim
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo
A
B

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

2do Trim
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo
A
B

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ 1,755,413.73
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -

3er Trim
\$ -
\$ 1,755,413.73
\$ -

Semáforo
A 0.00%
B 0.00%

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	-\$ 364,701.88
Devengado	\$ -	\$ -	\$ 919,495.53

4to Trim
\$ -
-\$ 364,701.88
\$ 919,495.53

Semáforo
A 0.00%
B -252.12%

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
41 - 60	Crítico	●
21 - 40	En riesgo	●
0 - 20	Aceptable	●
más de 61	Fallo en la planeación	●

Acumulado al Periodo	Total
Aprobado	\$ -
Modificado	\$ 1,390,711.85
Devengado	\$ 919,495.53


Semáforo
A 0.00%
B 66.12%

Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado

B. Porcentaje de avance del Modificado contra el Devengado


Arq. Alberto Kanek Zagal González
Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

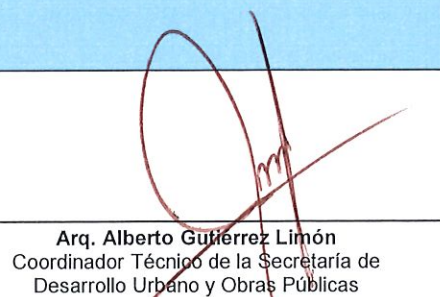
Arq. Alberto Gutiérrez Limón
Coordinador Técnico de la Secretaría de
Desarrollo Urbano y Obras Públicas

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

OP227

Construcción de pavimentación en Cuernavaca, localidad de Santa María Ahuacatitlán en la calle Ignacio Rayón

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

1er Trim
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo
A
B

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

2do Trim
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo
A
B

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ 2,631,353.74
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -

3er Trim
\$ -
\$ 2,631,353.74
\$ -

Semáforo
A 0.00%
B 0.00%
Aceptable

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ 15,623.39
Devengado	\$ -	\$ -	\$ 1,183,942.88

4to Trim
\$ -
\$ 15,623.39
\$ 1,183,942.88

Semáforo
A 0.00%
B -7578.02%
Aceptable

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
41 - 60	Crítico	●
21 - 40	En riesgo	●
0 - 20	Aceptable	●
más de 61	Fallo en la planeación	●


Acumulado al Periodo	Total
Aprobado	\$ -
Modificado	\$ 2,615,730.35
Devengado	\$ 1,183,942.88

Semáforo
A 0.00%
B 45.26%
Aceptable


Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado

B. Porcentaje de avance del Modificado contra el Devengado



Arq. Alberto Kanek Zagal González
Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas



Arq. Alberto Gutiérrez Limón
Coordinador Técnico de la Secretaría de
Desarrollo Urbano y Obras Públicas

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

OP228

Construcción de pavimentación en Cuernavaca, localidad Las Granjas en la calle Jiquilpan

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

1er Trim
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo
A
B

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

2do Trim
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo
A
B

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ 2,246,154.90
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -

3er Trim
\$ -
\$ 2,246,154.90
\$ -

Semáforo
A 0.00%
B 0.00%

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ 33,501.39
Devengado	\$ -	\$ -	\$ 1,053,758.21

4to Trim
\$ -
\$ 33,501.39
\$ 1,053,758.21

Semáforo
A 0.00%
B -3145.42%

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
41 - 60	Crítico	●
21 - 40	En riesgo	●
0 - 20	Aceptable	●
más de 61	Fallo en la planeación	●


Acumulado al Periodo	Total
Aprobado	\$ -
Modificado	\$ 2,212,653.51
Devengado	\$ 1,053,758.21


Semáforo
A 0.00%
B 47.62%

Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado

B. Porcentaje de avance del Modificado contra el Devengado


Arq. Alberto Kanek Zagal González
Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas


Arq. Alberto Gutiérrez Limón
Coordinador Técnico de la Secretaría de
Desarrollo Urbano y Obras Públicas

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

OP229

Construcción de pavimentación en Cuernavaca, localidad Las Granjas en la calle Diecisiete de Abril

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

1er Trim
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo
A
B

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

2do Trim
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo
A
B

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ 1,705,700.47
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -

3er Trim
\$ -
\$ 1,705,700.47
\$ -

Semáforo
A 0.00%
B 0.00%

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ 36,777.17
Devengado	\$ -	\$ -	\$ 1,538,644.82

4to Trim
\$ -
\$ 36,777.17
\$ 1,538,644.82

Semáforo
A 0.00%
B -4183.70%

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
41 - 60	Crítico	●
21 - 40	En riesgo	●
0 - 20	Aceptable	●
más de 61	Fallo en la planeación	●


Acumulado al Periodo	Total
Aprobado	\$ -
Modificado	\$ 1,668,923.30
Devengado	\$ 1,538,644.82

Semáforo
A 0.00%
B 92.19%


Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado

B. Porcentaje de avance del Modificado contra el Devengado



Arq. Alberto Kanek Zagal González
Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas



Arq. Alberto Gutiérrez Limón
Coordinador Técnico de la Secretaría de
Desarrollo Urbano y Obras Públicas

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

OP230

Construcción de pavimentación en Cuernavaca, localidad de Milpillás en la calle Pensamiento

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

1er Trim
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo
A
B

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

2do Trim
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo
A
B

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ 997,154.01
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -

3er Trim
\$ -
\$ 997,154.01
\$ -

Semáforo
A 0.00%
B 0.00%

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -

4to Trim
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo
A 0.00%
B 0.00%

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
41 - 60	Crítico	●
21 - 40	En riesgo	●
0 - 20	Aceptable	●
más de 61	Fallo en la planeación	●


Acumulado al Periodo	Total
Aprobado	\$ -
Modificado	\$ 997,154.01
Devengado	\$ -


Semáforo
A 0.00%
B 0.00%

Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado

B. Porcentaje de avance del Modificado contra el Devengado


Arq. Alberto Kanek Zagal González
Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas


Arq. Alberto Gutiérrez Limón
Coordinador Técnico de la Secretaría de
Desarrollo Urbano y Obras Públicas

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

OP231

Construcción de pavimentación en Cuernavaca, localidad de Milpillan en la calle Ejido

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

1er Trim
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo
A
B

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

2do Trim
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo
A
B

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ 1,484,693.93
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -

3er Trim
\$ -
\$ 1,484,693.93
\$ -

Semáforo
A 0.00%
B 0.00%

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -12,978.30
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -

4to Trim
\$ -
\$ -12,978.30
\$ -

Semáforo
A 0.00%
B 0.00%

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
41 - 60	Crítico	●
21 - 40	En riesgo	●
0 - 20	Aceptable	●
más de 61	Fallo en la planeación	●

Acumulado al Periodo	Total
Aprobado	\$ -
Modificado	\$ 1,471,715.63
Devengado	\$ -


Semáforo
A 0.00%
B 0.00%

Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado

B. Porcentaje de avance del Modificado contra el Devengado


Arq. Alberto Kanek Zagal González
Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas


Arq. Alberto Gutiérrez Limón
Coordinador Técnico de la Secretaría de
Desarrollo Urbano y Obras Públicas

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

OP232

Construcción de pavimentación en Cuernavaca, localidad de Milpillás en la calle Dalia

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

1er Trim
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo
A
B

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

2do Trim
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo
A
B

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ 2,049,455.91
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -

3er Trim
\$ -
\$ 2,049,455.91
\$ -

Semáforo
A 0.00%
B 0.00%
Acceptable

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ 47,961.98
Devengado	\$ -	\$ -	\$ 880,354.37

4to Trim
\$ -
\$ 47,961.98
\$ 880,354.37

Semáforo
A 0.00%
B -1835.53%
Acceptable

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
41 - 60	Crítico	●
21 - 40	En riesgo	●
0 - 20	Aceptable	●
más de 61	Fallo en la planeación	●


Acumulado al Periodo	Total
Aprobado	\$ -
Modificado	\$ 2,001,493.93
Devengado	\$ 880,354.37

Semáforo
A 0.00%
B 43.98%
Acceptable


Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado

B. Porcentaje de avance del Modificado contra el Devengado



Arq. Alberto Kanek Zagal González
Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas



Arq. Alberto Gutiérrez Limón
Coordinador Técnico de la Secretaría de
Desarrollo Urbano y Obras Públicas

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

OP233

Construcción de pavimentación en Cuernavaca, localidad de Bosques de Cuernavaca en la calle Albatros

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

1er Trim
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo
A
B

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

2do Trim
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo
A
B

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ 3,971,370.98
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -

3er Trim
\$ -
\$ 3,971,370.98
\$ -

Semáforo
A 0.00%
B 0.00%

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ 698,327.72
Devengado	\$ -	\$ -	\$ 3,752,226.09

4to Trim
\$ -
\$ 698,327.72
\$ 3,752,226.09

Semáforo
A 0.00%
B 537.32%

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
41 - 60	Crítico	●
21 - 40	En riesgo	●
0 - 20	Aceptable	●
más de 61	Fallo en la planeación	●


Acumulado al Periodo	Total
Aprobado	\$ -
Modificado	\$ 4,669,698.70
Devengado	\$ 3,752,226.09


Semáforo
A 0.00%
B 80.35%

Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado

B. Porcentaje de avance del Modificado contra el Devengado


Arq. Alberto Kanek Zagal González
 Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas


Arq. Alberto Gutiérrez Limón
 Coordinador Técnico de la Secretaría de
 Desarrollo Urbano y Obras Públicas

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

OP234

Construcción de pavimentación en Cuernavaca, localidad de Loma Bonita en la calle Faisán

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

1er Trim
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo
A
B

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

2do Trim
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo
A
B

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ 2,264,524.13
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -

3er Trim
\$ -
\$ 2,264,524.13
\$ -

Semáforo		
A	0.00%	Aceptable
B	0.00%	

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ 207,795.87
Devengado	\$ -	\$ -	\$ 1,729,969.34

4to Trim
\$ -
\$ 207,795.87
\$ 1,729,969.34

Semáforo		
A	0.00%	Aceptable
B	832.53%	

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
41 - 60	Crítico	●
21 - 40	En riesgo	●
0 - 20	Aceptable	●
más de 61	Fallo en la planeación	●


Acumulado al Periodo	Total
Aprobado	\$ -
Modificado	\$ 2,472,320.00
Devengado	\$ 1,729,969.34

Semáforo		
A	0.00%	Aceptable
B	69.97%	


Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado

B. Porcentaje de avance del Modificado contra el Devengado



Arq. Alberto Kanek Zagal González
Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas



Arq. Alberto Gutiérrez Limón
Coordinador Técnico de la Secretaría de
Desarrollo Urbano y Obras Públicas

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

OP235

Construcción de muro de contención en Cuernavaca, localidad Chipitlán en la calle Lidio Mancilla segunda etapa

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

1er Trim
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo
A
B

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

2do Trim
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo
A
B

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ 3,343,952.67
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -

3er Trim
\$ -
\$ 3,343,952.67
\$ -

Semáforo
A 0.00%
B 0.00%

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	-\$ 33,744.75
Devengado	\$ -	\$ -	\$ 1,826,315.50

4to Trim
\$ -
-\$ 33,744.75
\$ 1,826,315.50

Semáforo
A 0.00%
B -5412.15%

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
41 - 60	Crítico	●
21 - 40	En riesgo	●
0 - 20	Aceptable	●
más de 61	Fallo en la planeación	●


Acumulado al Periodo	Total
Aprobado	\$ -
Modificado	\$ 3,310,207.92
Devengado	\$ 1,826,315.50


Semáforo
A 0.00%
B 55.17%

Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado

B. Porcentaje de avance del Modificado contra el Devengado


Arq. Alberto Kanek Zagal González
Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas


Arq. Alberto Gutiérrez Limón
Coordinador Técnico de la Secretaría de
Desarrollo Urbano y Obras Públicas

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

OP236

Construcción de pavimentación en Cuernavaca, localidad de Santa María Ahuacatlán en la calle los Pinos

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

1er Trim
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo
A
B

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

2do Trim
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo
A
B

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ 2,283,700.21
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -

3er Trim
\$ -
\$ 2,283,700.21
\$ -

Semáforo
A
B

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ 199,220.52
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -

4to Trim
\$ -
\$ 199,220.52
\$ -

Semáforo
A
B

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
41 - 60	Crítico	●
21 - 40	En riesgo	●
0 - 20	Aceptable	●
más de 61	Fallo en la planeación	●


Acumulado al Periodo	Total
Aprobado	\$ -
Modificado	\$ 2,482,920.73
Devengado	\$ -

Semáforo
A
B

Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado

B. Porcentaje de avance del Modificado contra el Devengado


Arq. Alberto Kanek Zagal González
 Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas


Arq. Alberto Gutiérrez Limón
 Coordinador Técnico de la Secretaría de
 Desarrollo Urbano y Obras Públicas

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

OP237

Mantenimiento de Preescolar sanitarios en Cuernavaca, localidad Las Granjas en la calle Diez de Abril en el Jardín de Niños Estado de Morelos

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

1er Trim
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo
A
B

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

2do Trim
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo
A
B

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ 311,721.27
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -

3er Trim
\$ -
\$ 311,721.27
\$ -

Semáforo
A 0.00%
B 0.00%
Acceptable

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ 5,703.54
Devengado	\$ -	\$ -	\$ 122,418.30

4to Trim
\$ -
\$ 5,703.54
\$ 122,418.30

Semáforo
A 0.00%
B -2146.36%
Acceptable

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
41 - 60	Crítico	●
21 - 40	En riesgo	●
0 - 20	Aceptable	●
más de 61	Fallo en la planeación	●


Acumulado al Periodo	Total
Aprobado	\$ -
Modificado	\$ 306,017.73
Devengado	\$ 122,418.30

Semáforo
A 0.00%
B 40.00%
Acceptable


Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado

B. Porcentaje de avance del Modificado contra el Devengado



Arq. Alberto Kanek Zagal González
Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas



Arq. Alberto Gutiérrez Limón
Coordinador Técnico de la Secretaría de
Desarrollo Urbano y Obras Públicas

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

OP238

Construcción de techado en área de impartición de educación física en Cuernavaca, localidad Lagunilla del Salto en la calle Bolivia en el Jardín de Niños Jean Piaget

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

1er Trim
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo
A
B

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

2do Trim
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo
A
B

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ 1,074,207.58
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -

3er Trim
\$ -
\$ 1,074,207.58
\$ -

Semáforo
A 0.00%
B 0.00%
Acceptable

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ 78,488.67
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -

4to Trim
\$ -
\$ 78,488.67
\$ -

Semáforo
A 0.00%
B 0.00%
Acceptable

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
41 - 60	Crítico	●
21 - 40	En riesgo	●
0 - 20	Aceptable	●
más de 61	Fallo en la planeación	●


Acumulado al Periodo	Total
Aprobado	\$ -
Modificado	\$ 995,718.91
Devengado	\$ -


Semáforo
A 0.00%
B 0.00%
Acceptable

Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado

B. Porcentaje de avance del Modificado contra el Devengado


Arq. Alberto Kanek Zagal González
Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas


Arq. Alberto Gutiérrez Limón
Coordinador Técnico de la Secretaría de
Desarrollo Urbano y Obras Públicas

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

OP239

Construcción de techado en área de impartición de educación física en Cuernavaca, localidad de Lomas del Tzompante en la calle Diez de Mayo en el Jardín de Niños Tzompante

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

1er Trim
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo
A
B

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

2do Trim
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo
A
B

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ 1,024,919.59
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -

3er Trim
\$ -
\$ 1,024,919.59
\$ -

Semáforo
A 0.00%
B 0.00%
Acceptable

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -48,049.09
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -

4to Trim
\$ -
\$ -48,049.09
\$ -

Semáforo
A 0.00%
B 0.00%
Acceptable

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
41 - 60	Crítico	●
21 - 40	En riesgo	●
0 - 20	Aceptable	●
más de 61	Fallo en la planeación	●


Acumulado al Periodo	Total
Aprobado	\$ -
Modificado	\$ 976,870.50
Devengado	\$ -


Semáforo
A 0.00%
B 0.00%
Acceptable

Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado

B. Porcentaje de avance del Modificado contra el Devengado


Arq. Alberto Kanek Zagal González
Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas


Arq. Alberto Gutiérrez Limón
Coordinador Técnico de la Secretaría de
Desarrollo Urbano y Obras Públicas

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

OP240

Mantenimiento de Preescolar sanitarios en Cuernavaca, localidad Vicente Estrada Cajigal en la calle Doce de Octubre en el Jardín de Niños Hugo Arce Norato

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

1er Trim
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo
A
B

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

2do Trim
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo
A
B

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ 311,721.27
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -

3er Trim
\$ -
\$ 311,721.27
\$ -

Semáforo
A 0.00%
B 0.00%
Acceptable

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ 6,107.04
Devengado	\$ -	\$ -	\$ 123,993.32

4to Trim
\$ -
\$ 6,107.04
\$ 123,993.32

Semáforo
A 0.00%
B -2030.33%
Acceptable

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
41 - 60	Crítico	●
21 - 40	En riesgo	●
0 - 20	Aceptable	●
más de 61	Fallo en la planeación	●

Acumulado al Periodo	Total
Aprobado	\$ -
Modificado	\$ 305,614.23
Devengado	\$ 123,993.32

Semáforo
A 0.00%
B 40.57%
Acceptable

Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado

B. Porcentaje de avance del Modificado contra el Devengado


Arq. Alberto Kanek Zagal González
Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas


Arq. Alberto Gutiérrez Limón
Coordinador Técnico de la Secretaría de
Desarrollo Urbano y Obras Públicas

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

OP241

Mantenimiento de Primaria sanitarios en Cuernavaca, localidad de Chapultepec en la calle Sinaloa en la Escuela Primaria Urbana Federal Matutina Niños Héroes de Mil Ochocientos Cuarenta y Siete

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

1er Trim
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo
A
B

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

2do Trim
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo
A
B

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ 372,899.71
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -

3er Trim
\$ -
\$ 372,899.71
\$ -

Semáforo
A 0.00%
B 0.00%
Acceptable

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ 4,574.10
Devengado	\$ -	\$ -	\$ 148,116.33

4to Trim
\$ -
\$ 4,574.10
\$ 148,116.33

Semáforo
A 0.00%
B -3238.15%
Acceptable

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
41 - 60	Crítico	●
21 - 40	En riesgo	●
0 - 20	Aceptable	●
más de 61	Fallo en la planeación	●

Acumulado al Periodo	Total
Aprobado	\$ -
Modificado	\$ 368,325.61
Devengado	\$ 148,116.33


Semáforo
A 0.00%
B 40.21%
Acceptable

Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado

B. Porcentaje de avance del Modificado contra el Devengado


Arq. Alberto Kanek Zagal González
Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas


Arq. Alberto Gutiérrez Limón
Coordinador Técnico de la Secretaría de
Desarrollo Urbano y Obras Públicas

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

OP242

Construcción de techado en área de impartición de educación física en Cuernavaca, localidad Emiliano Zapata en la calle Otilio Montaño en el Jardín de Niños Quintana Roo

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

1er Trim
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo
A
B

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

2do Trim
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo
A
B

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ 1,089,876.18
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -

3er Trim
\$ -
\$ 1,089,876.18
\$ -

Semáforo
A 0.00%
B 0.00%
Acceptable

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ 51,615.63
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -

4to Trim
\$ -
\$ 51,615.63
\$ -

Semáforo
A 0.00%
B 0.00%
Acceptable

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
41 - 60	Crítico	●
21 - 40	En riesgo	●
0 - 20	Aceptable	●
más de 61	Fallo en la planeación	●


Acumulado al Periodo	Total
Aprobado	\$ -
Modificado	\$ 1,038,260.55
Devengado	\$ -


Semáforo
A 0.00%
B 0.00%
Acceptable

Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado

B. Porcentaje de avance del Modificado contra el Devengado


 Arq. Alberto Kanek Zagal González
 Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas


 Arq. Alberto Gutiérrez Limón
 Coordinador Técnico de la Secretaría de
 Desarrollo Urbano y Obras Públicas

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

OP243

Construcción de muro de contención en Cuernavaca, localidad Lomas de Tetela, avenida Subida a Chalma

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

1er Trim
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo
A
B

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

2do Trim
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo
A
B

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ 2,331,408.95
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -

3er Trim
\$ -
\$ 2,331,408.95
\$ -

Semáforo		
A	0.00%	Aceptable
B	0.00%	

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	-\$ 27,046.76
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -

4to Trim
\$ -
-\$ 27,046.76
\$ -

Semáforo		
A	0.00%	Aceptable
B	0.00%	

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
41 - 60	Crítico	●
21 - 40	En riesgo	●
0 - 20	Aceptable	●
más de 61	Fallo en la planeación	●

Acumulado al Periodo	Total
Aprobado	\$ -
Modificado	\$ 2,304,362.19
Devengado	\$ -


Semáforo		
A	0.00%	Aceptable
B	0.00%	

Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado

B. Porcentaje de avance del Modificado contra el Devengado


Arq. Alberto Kanek Zagal González
 Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas


Arq. Alberto Gutiérrez Limón
 Coordinador Técnico de la Secretaría de
 Desarrollo Urbano y Obras Públicas

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

OP244

Construcción de pavimentación en Cuernavaca, localidad Ricardo Flores Magón en la calle Vía del Ferrocarril

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

1er Trim
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo
A
B

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

2do Trim
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo
A
B

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ 3,251,200.61
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -

3er Trim
\$ -
\$ 3,251,200.61
\$ -

Semáforo		
A	0.00%	Acceptable
B	0.00%	

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ 5,680.61
Devengado	\$ -	\$ -	\$ 792,538.78

4to Trim
\$ -
\$ 5,680.61
\$ 792,538.78

Semáforo		
A	0.00%	Aceptable
B	-13951.65%	

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
41 - 60	Crítico	●
21 - 40	En riesgo	●
0 - 20	Aceptable	●
más de 61	Fallo en la planeación	●

Acumulado al Periodo	Total
Aprobado	\$ -
Modificado	\$ 3,245,520.00
Devengado	\$ 792,538.78


Semáforo		
A	0.00%	Aceptable
B	24.42%	

Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado

B. Porcentaje de avance del Modificado contra el Devengado


Arq. Alberto Kanek Zagal González
Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas


Arq. Alberto Gutiérrez Limón
Coordinador Técnico de la Secretaría de
Desarrollo Urbano y Obras Públicas

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

OP245

Mantenimiento de Primaria sanitarios en Cuernavaca, localidad de Ocotepéc en la calle José María Morelos en la Escuela Primaria Urbana Federal José María Morelos y Pavón

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

1er Trim
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo
A
B

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

2do Trim
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo
A
B

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ 372,751.16
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -

3er Trim
\$ -
\$ 372,751.16
\$ -

Semáforo
A 0.00%
B 0.00%
Acceptable

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ 3,725.10
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -

4to Trim
\$ -
\$ 3,725.10
\$ -

Semáforo
A 0.00%
B 0.00%
Acceptable

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
41 - 60	Crítico	●
21 - 40	En riesgo	●
0 - 20	Aceptable	●
más de 61	Fallo en la planeación	●


Acumulado al Periodo	Total
Aprobado	\$ -
Modificado	\$ 369,026.06
Devengado	\$ -

Semáforo
A 0.00%
B 0.00%
Acceptable


Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado

B. Porcentaje de avance del Modificado contra el Devengado



Arq. Alberto Kanek Zagal González
Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas



Arq. Alberto Gutiérrez Limón
Coordinador Técnico de la Secretaría de
Desarrollo Urbano y Obras Públicas

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

OP246

6 Rehabilitación de empedrado en Cuernavaca, localidad Santa María Ahuacatitlán en la calle Libertad

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

1er Trim
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo
A
B

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

2do Trim
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo
A
B

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

3er Trim
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo
A
B

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ 3,476,783.50	\$ -	-\$ 82,884.50
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -

4to Trim
\$ -
\$ 3,393,899.00
\$ -

Semáforo
A 0.00%
B 0.00%

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
41 - 60	Crítico	●
21 - 40	En riesgo	●
0 - 20	Aceptable	●
más de 61	Fallo en la planeación	●


Acumulado al Periodo	Total
Aprobado	\$ -
Modificado	\$ 3,393,899.00
Devengado	\$ -


Semáforo
A 0.00%
B 0.00%

Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado

B. Porcentaje de avance del Modificado contra el Devengado


Arq. Alberto Kanek Zagal González
Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas


Arq. Alberto Gutiérrez Limón
Coordinador Técnico de la Secretaría de
Desarrollo Urbano y Obras Públicas

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

OP247

Construcción de Pavimentación en Cuernavaca, localidad Ricardo Flores Magon en la calle Via del Ferrocarril entre calle Jacaranda y calle Veintiuno de Noviembre

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

1er Trim
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo
A
B

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

2do Trim
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo
A
B

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

3er Trim
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo
A
B

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ 3,262,698.85	\$ -	-\$ 17,198.85
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -

4to Trim
\$ -
\$ 3,245,500.00
\$ -

Semáforo
A 0.00%
B 0.00%

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
41 - 60	Crítico	●
21 - 40	En riesgo	●
0 - 20	Aceptable	●
más de 61	Fallo en la planeación	●


Acumulado al Periodo	Total
Aprobado	\$ -
Modificado	\$ 3,245,500.00
Devengado	\$ -


Semáforo
A 0.00%
B 0.00%

Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado

B. Porcentaje de avance del Modificado contra el Devengado


Arq. Alberto Kanek Zagal González
Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas


Arq. Alberto Gutiérrez Limón
Coordinador Técnico de la Secretaría de
Desarrollo Urbano y Obras Públicas

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

OP248

Rehabilitación de empedrado en Cuernavaca localidad de ocotepec en la calle Emiliano Zapata segunda etapa

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

1er Trim
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo
A
B

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

2do Trim
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo
A
B

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

3er Trim
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo
A
B

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ 941,884.64	\$ -	-\$ 9,116.00
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -

4to Trim
\$ -
\$ 932,768.64
\$ -

Semáforo
A 0.00%
B 0.00%

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
41 - 60	Crítico	●
21 - 40	En riesgo	●
0 - 20	Aceptable	●
más de 61	Fallo en la planeación	●

Acumulado al Periodo	Total
Aprobado	\$ -
Modificado	\$ 932,768.64
Devengado	\$ -


Semáforo
A 0.00%
B 0.00%

Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado

B. Porcentaje de avance del Modificado contra el Devengado


Arq. Alberto Kanek Zagal González
 Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas


Arq. Alberto Gutiérrez Limón
 Coordinador Técnico de la Secretaría de
 Desarrollo Urbano y Obras Públicas

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

OP249

Construcción de pavimentación en Cuernavaca localidad de Tetela del Monte en la calle Popotla segunda etapa

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

1er Trim
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo
A
B

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

2do Trim
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo
A
B

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

3er Trim
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo
A
B

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ 1,799,999.60	\$ -	\$ -11,250.74
Devengado	\$ -	\$ -	\$ 1,788,748.86

4to Trim
\$ -
\$ 1,788,748.86
\$ 1,788,748.86

Semáforo
A 0.00%
B 100.00%

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
41 - 60	Crítico	●
21 - 40	En riesgo	●
0 - 20	Aceptable	●
más de 61	Fallo en la planeación	●


Acumulado al Periodo	Total
Aprobado	\$ -
Modificado	\$ 1,788,748.86
Devengado	\$ 1,788,748.86


Semáforo
A 0.00%
B 100.00%

Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado

B. Porcentaje de avance del Modificado contra el Devengado


Arq. Alberto Kanek Zagal González
Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas


Arq. Alberto Gutiérrez Limón
Coordinador Técnico de la Secretaría de
Desarrollo Urbano y Obras Públicas

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

OP250

Construcción de drenaje sanitario en Cuernavaca Localidad de Chamilpa en la calle Defensa Nacional

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

1er Trim
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo
A
B

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

2do Trim
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo
A
B

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

3er Trim
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo
A
B

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ 1,151,441.58	\$ -	-\$ 28,282.70
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -

4to Trim
\$ -
\$ 1,123,158.88
\$ -

Semáforo
A 0.00%
B 0.00%

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
41 - 60	Crítico	●
21 - 40	En riesgo	●
0 - 20	Aceptable	●
más de 61	Fallo en la planeación	●


Acumulado al Periodo	Total
Aprobado	\$ -
Modificado	\$ 1,123,158.88
Devengado	\$ -


Semáforo
A 0.00%
B 0.00%

Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado

B. Porcentaje de avance del Modificado contra el Devengado


Arq. Alberto Kanek Zagal González
Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas


Arq. Alberto Gutiérrez Limón
Coordinador Técnico de la Secretaría de
Desarrollo Urbano y Obras Públicas

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

OP251

Rehabilitación de Canchas y Espacios Multideportivos en Cuernavaca, localidad de los Pilares

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

1er Trim
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo
A
B

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

2do Trim
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo
A
B

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

3er Trim
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo
A
B

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ 1,269,565.96	\$ -	\$ -38,526.05
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -

4to Trim
\$ -
\$ 1,231,039.91
\$ -

Semáforo
A 0.00%
B 0.00%

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
41 - 60	Crítico	●
21 - 40	En riesgo	●
0 - 20	Aceptable	●
más de 61	Fallo en la planeación	●


Acumulado al Periodo	Total
Aprobado	\$ -
Modificado	\$ 1,231,039.91
Devengado	\$ -

Semáforo
A 0.00%
B 0.00%


Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado

B. Porcentaje de avance del Modificado contra el Devengado



Arq. Alberto Kanek Zagal González
Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas



Arq. Alberto Gutiérrez Limón
Coordinador Técnico de la Secretaría de
Desarrollo Urbano y Obras Públicas

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

OP252

Construcción de pavimentación en Cuernavaca localidad de Chapultepec en la calle Tamaulipas

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

1er Trim
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo
A
B

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

2do Trim
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo
A
B

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

3er Trim
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo
A
B

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ 217,381.83	\$ -	-\$ 21,082.30
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -

4to Trim
\$ -
\$ 196,299.53
\$ -

Semáforo
A 0.00%
B 0.00%

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
41 - 60	Crítico	●
21 - 40	En riesgo	●
0 - 20	Aceptable	●
más de 61	Fallo en la planeación	●

Acumulado al Periodo	Total
Aprobado	\$ -
Modificado	\$ 196,299.53
Devengado	\$ -

Semáforo
A 0.00%
B 0.00%


Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado

B. Porcentaje de avance del Modificado contra el Devengado



Arq. Alberto Kanek Zagal González
Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas



Arq. Alberto Gutiérrez Limón
Coordinador Técnico de la Secretaría de
Desarrollo Urbano y Obras Públicas

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

OP253

Construcción de drenaje sanitario en Cuernavaca localidad de Lázaro Cárdenas del Río en la calle Sinaloa

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

1er Trim
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo
A
B

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

2do Trim
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo
A
B

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

3er Trim
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo
A
B

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ 1,625,366.70	\$ -	-\$ 197,106.50
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -

4to Trim
\$ -
\$ 1,428,260.20
\$ -

Semáforo
A 0.00%
B 0.00%

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
41 - 60	Crítico	●
21 - 40	En riesgo	●
0 - 20	Aceptable	●
más de 61	Fallo en la planeación	●


Acumulado al Periodo	Total
Aprobado	\$ -
Modificado	\$ 1,428,260.20
Devengado	\$ -

Semáforo
A 0.00%
B 0.00%


Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado

B. Porcentaje de avance del Modificado contra el Devengado



Arq. Alberto Kanek Zagal González
Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

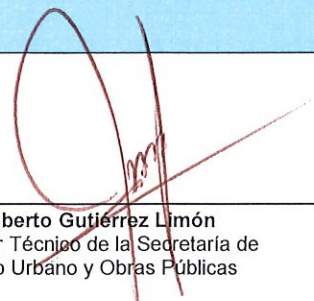

Arq. Alberto Gutiérrez Limón
Coordinador Técnico de la Secretaría de
Desarrollo Urbano y Obras Públicas

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

OP254

Construcción de drenaje pluvial en Cuernavaca localidad Club de Golf en la calle Plutarco Elías Calles esquina con Álvaro Obregón

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

1er Trim
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo
A
B

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

2do Trim
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo
A
B

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

3er Trim
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo
A
B

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ 719,947.31	\$ -	-\$ 53,491.62
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -

4to Trim
\$ -
\$ 666,455.69
\$ -

Semáforo
A 0.00%
B 0.00%

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
41 - 60	Crítico	●
21 - 40	En riesgo	●
0 - 20	Aceptable	●
más de 61	Fallo en la planeación	●


Acumulado al Periodo	Total
Aprobado	\$ -
Modificado	\$ 666,455.69
Devengado	\$ -

Semáforo
A 0.00%
B 0.00%

Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado

B. Porcentaje de avance del Modificado contra el Devengado



Arq. Alberto Kanek Zagal González
Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas



Arq. Alberto Gutiérrez Limón
Coordinador Técnico de la Secretaría de
Desarrollo Urbano y Obras Públicas

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

OP255

Construcción de drenaje sanitario en Cuernavaca localidad de Lomas de la Selva en la avenida Vicente Guerrero

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

1er Trim
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo
A
B

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

2do Trim
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo
A
B

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

3er Trim
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo
A
B

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ 343,481.05	\$ -	\$ 514.21
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -

4to Trim
\$ -
\$ 342,966.84
\$ -

Semáforo
A 0.00%
B 0.00%

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
41 - 60	Crítico	●
21 - 40	En riesgo	●
0 - 20	Aceptable	●
más de 61	Fallo en la planeación	●

Acumulado al Periodo	Total
Aprobado	\$ -
Modificado	\$ 342,966.84
Devengado	\$ -


Semáforo
A 0.00%
B 0.00%

Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado

B. Porcentaje de avance del Modificado contra el Devengado


Arq. Alberto Kanek Zagal González
Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas


Arq. Alberto Gutiérrez Limón
Coordinador Técnico de la Secretaría de
Desarrollo Urbano y Obras Públicas

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

OP256

Construcción de drenaje pluvial en Cuernavaca localidad Ricardo Flores Magón en la calle Paseo de los Ficus y calle Treinta y Dos

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

1er Trim
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo
A
B

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

2do Trim
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo
A
B

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

3er Trim
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo
A
B

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ 516,825.11	\$ -	-\$ 18,575.11
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -

4to Trim
\$ -
\$ 498,250.00
\$ -

Semáforo
A 0.00%
B 0.00%

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
41 - 60	Crítico	●
21 - 40	En riesgo	●
0 - 20	Aceptable	●
más de 61	Fallo en la planeación	●


Acumulado al Periodo	Total
Aprobado	\$ -
Modificado	\$ 498,250.00
Devengado	\$ -

Semáforo
A 0.00%
B 0.00%

Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado

B. Porcentaje de avance del Modificado contra el Devengado


Arq. Alberto Kanek Zagal González
Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas


Arq. Alberto Gutiérrez Limón
Coordinador Técnico de la Secretaría de
Desarrollo Urbano y Obras Públicas

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

OP257

Fortalecimiento del Desarrollo Urbano

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

1er Trim
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo
A
B

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

2do Trim
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo
A
B

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

3er Trim
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo
A
B

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ 3,919,371.01	\$ 73,801.53	-\$ 337,153.54
Devengado	\$ 581,088.74	\$ 734,736.81	\$ 2,209,848.83

4to Trim
\$ -
\$ 3,656,019.00
\$ 3,525,674.38

Semáforo
A 0.00%
B 96.43%

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
41 - 60	Crítico	●
21 - 40	En riesgo	●
0 - 20	Aceptable	●
más de 61	Fallo en la planeación	●

Acumulado al Periodo	Total
Aprobado	\$ -
Modificado	\$ 3,656,019.00
Devengado	\$ 3,525,674.38

Semáforo
A 0.00%
B 96.43%


Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado

B. Porcentaje de avance del Modificado contra el Devengado



Arq. Alberto Kanek Zagal González
Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas



Arq. Alberto Gutiérrez Limón
Coordinador Técnico de la Secretaría de
Desarrollo Urbano y Obras Públicas

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

OP258

Gestión Administrativa

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

1er Trim
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo
A
B

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

2do Trim
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo
A
B

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

3er Trim
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo
A
B

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ 118,176.14	\$ 117,107.12	\$ 237,995.64
Devengado	\$ 108,469.10	\$ 113,361.50	\$ 247,311.75

4to Trim
\$ -
\$ 473,278.90
\$ 469,142.35

Semáforo
A
B


Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
41 - 60	Crítico	●
21 - 40	En riesgo	●
0 - 20	Aceptable	●
más de 61	Fallo en la planeación	●

Acumulado al Periodo	Total
Aprobado	\$ -
Modificado	\$ 473,278.90
Devengado	\$ 469,142.35


Semáforo
A
B

Comentarios:

- A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado
- B. Porcentaje de avance del Modificado contra el Devengado



Arq. Alberto Kanek Zagal González
Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas



Arq. Alberto Gutiérrez Limón
Coordinador Técnico de la Secretaría de
Desarrollo Urbano y Obras Públicas

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

OP259

Fortalecimiento del Desarrollo Urbano (Bansí, S.A.)

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

1er Trim
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo
A
B

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

2do Trim
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo
A
B

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

3er Trim
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo
A
B

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ 1,172,056.73
Devengado	\$ -	\$ -	\$ 1,172,056.73

4to Trim
\$ -
\$ 1,172,056.73
\$ 1,172,056.73

Semáforo
A
B


Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
41 - 60	Crítico	●
21 - 40	En riesgo	●
0 - 20	Aceptable	●
más de 61	Fallo en la planeación	●

Acumulado al Periodo	Total
Aprobado	\$ -
Modificado	\$ 1,172,056.73
Devengado	\$ 1,172,056.73


Semáforo
A
B

Comentarios:

- A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado
- B. Porcentaje de avance del Modificado contra el Devengado



Arq. Alberto Kanek Zagal González
Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas



Arq. Alberto Gutiérrez Limón
Coordinador Técnico de la Secretaría de
Desarrollo Urbano y Obras Públicas

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

OP260

Gestión Administrativa (Bansí, S.A.)

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

1er Trim
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo
A
B

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

2do Trim
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo
A
B

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

3er Trim
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo
A
B

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ 203,093.71
Devengado	\$ -	\$ -	\$ 203,093.71

4to Trim
\$ -
\$ 203,093.71
\$ 203,093.71

Semáforo
A 0.00%
B 100.00%
Acceptable

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
41 - 60	Crítico	●
21 - 40	En riesgo	●
0 - 20	Aceptable	●
más de 61	Fallo en la planeación	●


Acumulado al Periodo	Total
Aprobado	\$ -
Modificado	\$ 203,093.71
Devengado	\$ 203,093.71


Semáforo
A 0.00%
B 100.00%
Acceptable

Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado

B. Porcentaje de avance del Modificado contra el Devengado


Arq. Alberto Kanek Zagal González
 Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas


Arq. Alberto Gutiérrez Limón
 Coordinador Técnico de la Secretaría de
 Desarrollo Urbano y Obras Públicas

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

OP112

Construcción de tanque elevado de agua potable en la colonia Ajonjolinar

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ 1,537,602.30	\$ -	\$ -
Devengado	\$ 926,157.42	\$ -	\$ 611,444.88

1er Trim
\$ -
\$ 1,537,602.30
\$ 1,537,602.30

Semáforo
A 0.00%
B 100.00%
Acceptable

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -

2do Trim
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo
A 0.00%
B 0.00%
Acceptable

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -

3er Trim
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo
A 0.00%
B 0.00%
Acceptable

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -

4to Trim
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo
A 0.00%
B 0.00%
Acceptable

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
41 - 60	Crítico	●
21 - 40	En riesgo	●
0 - 20	Aceptable	●
más de 61	Fallo en la planeación	●


Acumulado al Periodo	Total
Aprobado	\$ -
Modificado	\$ 1,537,602.30
Devengado	\$ 1,537,602.30

Semáforo
A 0.00%
B 100.00%
Acceptable


Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado

B. Porcentaje de avance del Modificado contra el Devengado



Arq. Alberto Kanek Zagal González
Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas



Arq. Alberto Gutiérrez Limón
Coordinador Técnico de la Secretaría de
Desarrollo Urbano y Obras Públicas

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

OP115

Construcción de techado en el jardín de niños Club de Leones

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ 688,196.87	\$ -	\$ -
Devengado	\$ 438,753.62	\$ -	\$ 249,443.25

1er Trim
\$ -
\$ 688,196.87
\$ 688,196.87

Semáforo
A 0.00% Aceptable
B 100.00%

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -

2do Trim
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo
A 0.00% Aceptable
B 0.00%

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -

3er Trim
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo
A 0.00% Aceptable
B 0.00%

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -

4to Trim
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo
A 0.00% Aceptable
B 0.00%

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
41 - 60	Crítico	●
21 - 40	En riesgo	●
0 - 20	Aceptable	●
más de 61	Fallo en la planeación	●


Acumulado al Periodo	Total
Aprobado	\$ -
Modificado	\$ 688,196.87
Devengado	\$ 688,196.87

Semáforo
A 0.00% Aceptable
B 100.00%


Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado

B. Porcentaje de avance del Modificado contra el Devengado



Arq. Alberto Kanek Zagal González
Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas



Arq. Alberto Gutiérrez Limón
Coordinador Técnico de la Secretaría de
Desarrollo Urbano y Obras Públicas

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

OP117

Construcción de techado en el jardín de niños Frida Khalo

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ 376,737.34	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ 376,737.34

1er Trim
\$ -
\$ 376,737.34
\$ 376,737.34

Semáforo	
A	0.00%
B	100.00%
Aceptable	

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -

2do Trim
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo	
A	0.00%
B	0.00%
Aceptable	

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -

3er Trim
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo	
A	0.00%
B	0.00%
Aceptable	

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -

4to Trim
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo	
A	0.00%
B	0.00%
Aceptable	

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
41 - 60	Crítico	●
21 - 40	En riesgo	●
0 - 20	Aceptable	●
más de 61	Fallo en la planeación	●

Acumulado al Periodo	Total
Aprobado	\$ -
Modificado	\$ 376,737.34
Devengado	\$ 376,737.34


Semáforo	
A	0.00%
B	100.00%
Aceptable	

Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado

B. Porcentaje de avance del Modificado contra el Devengado


Arq. Alberto Kanek Zagal González
Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas


Arq. Alberto Gutiérrez Limón
Coordinador Técnico de la Secretaría de
Desarrollo Urbano y Obras Públicas

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

OP118

Construcción de red de agua potable calle Flamings y Flores

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ 816,400.20	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ 666,264.14	\$ 150,136.06

1er Trim
\$ -
\$ 816,400.20
\$ 816,400.20

Semáforo
A 0.00% Aceptable
B 100.00%

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -

2do Trim
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo
A 0.00% Aceptable
B 0.00%

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -

3er Trim
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo
A 0.00% Aceptable
B 0.00%

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -

4to Trim
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo
A 0.00% Aceptable
B 0.00%

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
41 - 60	Crítico	●
21 - 40	En riesgo	●
0 - 20	Aceptable	●
más de 61	Fallo en la planeación	●


Acumulado al Periodo	Total
Aprobado	\$ -
Modificado	\$ 816,400.20
Devengado	\$ 816,400.20


Semáforo
A 0.00% Aceptable
B 100.00%

Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado

B. Porcentaje de avance del Modificado contra el Devengado


Arq. Alberto Kanek Zagal González
Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas


Arq. Alberto Gutiérrez Limón
Coordinador Técnico de la Secretaría de
Desarrollo Urbano y Obras Públicas

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

OP119

Construcción de red de agua potable circuito Las Joyas

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ 638,596.56	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ 520,354.66	\$ 118,241.90

1er Trim
\$ -
\$ 638,596.56
\$ 638,596.56

Semáforo
A 0.00%
B 100.00%
Aceptable

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -

2do Trim
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo
A 0.00%
B 0.00%
Aceptable

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -

3er Trim
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo
A 0.00%
B 0.00%
Aceptable

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -

4to Trim
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo
A 0.00%
B 0.00%
Aceptable

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
41 - 60	Crítico	●
21 - 40	En riesgo	●
0 - 20	Aceptable	●
más de 61	Fallo en la planeación	●


Acumulado al Periodo	Total
Aprobado	\$ -
Modificado	\$ 638,596.56
Devengado	\$ 638,596.56

Semáforo
A 0.00%
B 100.00%
Aceptable


Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado

B. Porcentaje de avance del Modificado contra el Devengado



Arq. Alberto Kanek Zagal González
Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas



Arq. Alberto Gutiérrez Limón
Coordinador Técnico de la Secretaría de
Desarrollo Urbano y Obras Públicas



4to Trimestre 2020

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

OP120

Construcción de pavimento de concreto hidráulico en calle Francisco I. Madero tercera etapa

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	\$ -	\$ -	
Modificado	\$ 1,541,272.55	\$ -	
Devengado	\$ -	\$ 1,541,272.55	

1er Trim
\$ -
\$ 1,541,272.55
\$ 1,541,272.55

Semáforo
A 0.00% Aceptable
B 100.00%

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -

2do Trim
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo
A 0.00% Aceptable
B 0.00%

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -

3er Trim
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo
A 0.00% Aceptable
B 0.00%

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -

4to Trim
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo
A 0.00% Aceptable
B 0.00%

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
41 - 60	Crítico	●
21 - 40	En riesgo	●
0 - 20	Aceptable	●
más de 61	Fallo en la planeación	●

Acumulado al Periodo	Total
Aprobado	\$ -
Modificado	\$ 1,541,272.55
Devengado	\$ 1,541,272.55


Semáforo
A 0.00% Aceptable
B 100.00%

Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado

B. Porcentaje de avance del Modificado contra el Devengado


Arq. Alberto Kanek Zagal González
Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas


Arq. Alberto Gutiérrez Limón
Coordinador Técnico de la Secretaría de
Desarrollo Urbano y Obras Públicas

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

OP122

Construcción de drenaje sanitario en privada tecampanario

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ 208,154.48	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ 207,995.20	\$ 159.28

1er Trim
\$ -
\$ 208,154.48
\$ 208,154.48

Semáforo
A 0.00%
B 100.00%
Acceptable

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -

2do Trim
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo
A 0.00%
B 0.00%
Acceptable

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -

3er Trim
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo
A 0.00%
B 0.00%
Acceptable

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -

4to Trim
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo
A 0.00%
B 0.00%
Acceptable

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
41 - 60	Crítico	●
21 - 40	En riesgo	●
0 - 20	Aceptable	●
más de 61	Fallo en la planeación	●


Acumulado al Periodo	Total
Aprobado	\$ -
Modificado	\$ 208,154.48
Devengado	\$ 208,154.48

Semáforo
A 0.00%
B 100.00%
Acceptable


Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado

B. Porcentaje de avance del Modificado contra el Devengado



Arq. Alberto Kanek Zagal González
Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

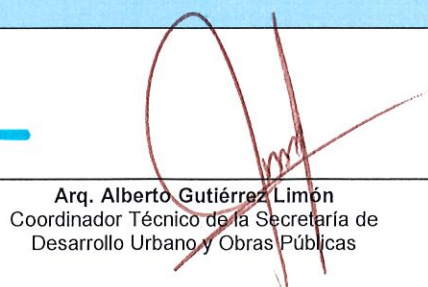

Arq. Alberto Gutiérrez Limón
Coordinador Técnico de la Secretaría de
Desarrollo Urbano y Obras Públicas

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

OP123

Construcción de depósito para agua potable en santa maría ahuacatitlan

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ 904,292.81	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ 904,292.81

1er Trim
\$ -
\$ 904,292.81
\$ 904,292.81

Semáforo
A 0.00%
B 100.00%

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -

2do Trim
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo
A 0.00%
B 0.00%

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -

3er Trim
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo
A 0.00%
B 0.00%

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -

4to Trim
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo
A 0.00%
B 0.00%

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
41 - 60	Crítico	●
21 - 40	En riesgo	●
0 - 20	Aceptable	●
más de 61	Fallo en la planeación	●


Acumulado al Periodo	Total
Aprobado	\$ -
Modificado	\$ 904,292.81
Devengado	\$ 904,292.81

Semáforo
A 0.00%
B 100.00%


Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado

B. Porcentaje de avance del Modificado contra el Devengado



Arq. Alberto Kanek Zagal González
Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas



Arq. Alberto Gutiérrez Limón
Coordinador Técnico de la Secretaría de
Desarrollo Urbano y Obras Públicas

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

OP104

Ramo 33, Fondo 3, Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM)

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ 39,842.52	\$ -	\$ -
Devengado	\$ 39,842.52	\$ -	\$ -

1er Trim
\$ -
\$ 39,842.52
\$ 39,842.52

Semáforo
A 0.00%
B 100.00%
Acceptable

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ 8,499.80	\$ -	\$ -
Devengado	\$ 8,499.80	\$ -	\$ -

2do Trim
\$ -
\$ 8,499.80
\$ 8,499.80

Semáforo
A 0.00%
B 100.00%
Acceptable

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -

3er Trim
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo
A 0.00%
B 0.00%
Acceptable

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -

4to Trim
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo
A 0.00%
B 0.00%
Acceptable

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
41 - 60	Crítico	●
21 - 40	En riesgo	●
0 - 20	Aceptable	●
más de 61	Fallo en la planeación	●


Acumulado al Periodo	Total
Aprobado	\$ -
Modificado	\$ 48,342.32
Devengado	\$ 48,342.32


Semáforo
A 0.00%
B 100.00%
Acceptable

Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado

B. Porcentaje de avance del Modificado contra el Devengado


 Arq. Alberto Kanek Zagal González
 Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas


 Arq. Alberto Gutiérrez Limón
 Coordinador Técnico de la Secretaría de
 Desarrollo Urbano y Obras Públicas

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

OP128

Construcción de drenaje sanitario de la calle Tulia

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ 59,571.51	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ 59,417.45	\$ 154.06

1er Trim
\$ -
\$ 59,571.51
\$ 59,571.51

Semáforo	
A	0.00%
B	100.00%

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -

2do Trim
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo		
A	0.00%	Aceptable
B	0.00%	

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -

3er Trim
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo	
A	0.00%
B	0.00%

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -

4to Trim
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo		
A	0.00%	Aceptable
B	0.00%	

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
41 - 60	Crítico	●
21 - 40	En riesgo	●
0 - 20	Aceptable	●
más de 61	Fallo en la planeación	●


Acumulado al Periodo	Total
Aprobado	\$ -
Modificado	\$ 59,571.51
Devengado	\$ 59,571.51

Semáforo		
A	0.00%	Aceptable
B	100.00%	


Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado

B. Porcentaje de avance del Modificado contra el Devengado



Arq. Alberto Kanek Zagal González
Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas



Arq. Alberto Gutiérrez Limón
Coordinador Técnico de la Secretaría de
Desarrollo Urbano y Obras Públicas

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

OP130

Construcción de techado en la escuela primaria profesor Rafael Ramírez

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ 368,670.27	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ 363,615.60	\$ 5,054.67

1er Trim
\$ -
\$ 368,670.27
\$ 368,670.27

Semáforo
A 0.00%
B 100.00%
Aceptable

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -

2do Trim
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo
A 0.00%
B 0.00%
Aceptable

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -

3er Trim
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo
A 0.00%
B 0.00%
Aceptable

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -

4to Trim
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo
A 0.00%
B 0.00%
Aceptable

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
41 - 60	Crítico	●
21 - 40	En riesgo	●
0 - 20	Aceptable	●
más de 61	Fallo en la planeación	●

Acumulado al Periodo	Total
Aprobado	\$ -
Modificado	\$ 368,670.27
Devengado	\$ 368,670.27

Semáforo
A 0.00%
B 100.00%
Aceptable


Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado

B. Porcentaje de avance del Modificado contra el Devengado



Arq. Alberto Kanek Zagal González
Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas



Arq. Alberto Gutiérrez Limón
Coordinador Técnico de la Secretaría de
Desarrollo Urbano y Obras Públicas

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

OP132

Construcción de pavimento de concreto hidráulico en la calle Popotla norte entre calles Amates y Potreritos

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ 1,373,799.06	\$ -	\$ -
Devengado	\$ 1,373,799.06	\$ -	\$ -

1er Trim
\$ -
\$ 1,373,799.06
\$ 1,373,799.06

Semáforo		
A	0.00%	Aceptable
B	100.00%	

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -

2do Trim
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo		
A	0.00%	Aceptable
B	0.00%	

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -

3er Trim
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo		
A	0.00%	Aceptable
B	0.00%	

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -

4to Trim
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo		
A	0.00%	Aceptable
B	0.00%	

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
41 - 60	Crítico	●
21 - 40	En riesgo	●
0 - 20	Aceptable	●
más de 61	Fallo en la planeación	●

Acumulado al Periodo	Total
Aprobado	\$ -
Modificado	\$ 1,373,799.06
Devengado	\$ 1,373,799.06

Semáforo		
A	0.00%	Aceptable
B	100.00%	

Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado

B. Porcentaje de avance del Modificado contra el Devengado

Arq. Alberto Kanek Zagal González
Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

Arq. Alberto Gutiérrez Limón
Coordinador Técnico de la Secretaría de
Desarrollo Urbano y Obras Públicas

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

OP133

Construcción de pavimento de concreto hidráulico en la calle Emiliano Zapata

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ 1,520,784.50	\$ -	\$ -
Devengado	\$ 475,587.58	\$ -	\$ 1,045,196.92

1er Trim
\$ -
\$ 1,520,784.50
\$ 1,520,784.50

Semáforo	
A	0.00%
B	100.00%

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -

2do Trim
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo		
A	0.00%	Aceptable
B	0.00%	

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -

3er Trim
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo		
A	0.00%	Aceptable
B	0.00%	

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -

4to Trim
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo		
A	0.00%	Aceptable
B	0.00%	

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
41 - 60	Crítico	●
21 - 40	En riesgo	●
0 - 20	Aceptable	●
más de 61	Fallo en la planeación	●

Acumulado al Periodo	Total
Aprobado	\$ -
Modificado	\$ 1,520,784.50
Devengado	\$ 1,520,784.50

Semáforo	
A	0.00%
B	100.00%

Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado

B. Porcentaje de avance del Modificado contra el Devengado

Arq. Alberto Kanek Zagal González
Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

Arq. Alberto Gutiérrez Limón
Coordinador Técnico de la Secretaría de
Desarrollo Urbano y Obras Públicas

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

OP135

Rehabilitación de sanitarios en la escuela secundaria técnica N°44

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ 210,335.24	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ 209,382.42	\$ 952.82

1er Trim
\$ -
\$ 210,335.24
\$ 210,335.24

Semáforo
A 0.00%
B 100.00%
Acceptable

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -

2do Trim
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo
A 0.00%
B 0.00%
Acceptable

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -

3er Trim
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo
A 0.00%
B 0.00%
Acceptable

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -

4to Trim
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo
A 0.00%
B 0.00%
Acceptable

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
41 - 60	Crítico	●
21 - 40	En riesgo	●
0 - 20	Aceptable	●
más de 61	Fallo en la planeación	●

Acumulado al Periodo	Total
Aprobado	\$ -
Modificado	\$ 210,335.24
Devengado	\$ 210,335.24


Semáforo
A 0.00%
B 100.00%
Acceptable

Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado

B. Porcentaje de avance del Modificado contra el Devengado


 Arq. Alberto Kanek Zagal González
 Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas


 Arq. Alberto Gutiérrez Limón
 Coordinador Técnico de la Secretaría de
 Desarrollo Urbano y Obras Públicas

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

OP137

Rehabilitación de centro de desarrollo comunitario Carolina

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ 957,920.07	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ 957,920.07

1er Trim
\$ -
\$ 957,920.07
\$ 957,920.07

Semáforo
A 0.00%
B 100.00%
Acceptable

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -

2do Trim
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo
A 0.00%
B 0.00%
Acceptable

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -

3er Trim
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo
A 0.00%
B 0.00%
Acceptable

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -

4to Trim
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo
A 0.00%
B 0.00%
Acceptable

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
41 - 60	Crítico	●
21 - 40	En riesgo	●
0 - 20	Aceptable	●
más de 61	Fallo en la planeación	●

Acumulado al Periodo	Total
Aprobado	\$ -
Modificado	\$ 957,920.07
Devengado	\$ 957,920.07


Semáforo
A 0.00%
B 100.00%
Acceptable

Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado

B. Porcentaje de avance del Modificado contra el Devengado


Arq. Alberto Kanek Zagal González
Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas


Arq. Alberto Gutiérrez Limón
Coordinador Técnico de la Secretaría de
Desarrollo Urbano y Obras Públicas

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

OP138

Rehabilitación de centro de desarrollo comunitario Cuauhtemoc

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ 1,348,835.44	\$ -	\$ -
Devengado	\$ 194,619.28	\$ -	\$ 1,154,216.16

1er Trim
\$ -
\$ 1,348,835.44
\$ 1,348,835.44

Semáforo		
A	0.00%	Acceptable
B	100.00%	

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -

2do Trim
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo		
A	0.00%	Aceptable
B	0.00%	

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -

3er Trim
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo		
A	0.00%	Aceptable
B	0.00%	

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -

4to Trim
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo		
A	0.00%	Aceptable
B	0.00%	

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
41 - 60	Crítico	●
21 - 40	En riesgo	●
0 - 20	Aceptable	●
más de 61	Fallo en la planeación	●


Acumulado al Periodo	Total
Aprobado	\$ -
Modificado	\$ 1,348,835.44
Devengado	\$ 1,348,835.44

Semáforo		
A	0.00%	Acceptable
B	100.00%	


Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado

B. Porcentaje de avance del Modificado contra el Devengado



Arq. Alberto Kanek Zagal González
Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas



Arq. Alberto Gutiérrez Limón
Coordinador Técnico de la Secretaría de
Desarrollo Urbano y Obras Públicas

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

OP139

Rehabilitación de centro de desarrollo comunitario Villa Santiago

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ 327,757.69	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ 326,150.92	\$ 1,606.77

1er Trim
\$ -
\$ 327,757.69
\$ 327,757.69

Semáforo
A 0.00%
B 100.00%
Acceptable

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -

2do Trim
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo
A 0.00%
B 0.00%
Acceptable

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -

3er Trim
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo
A 0.00%
B 0.00%
Acceptable

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -

4to Trim
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo
A 0.00%
B 0.00%
Acceptable

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
41 - 60	Crítico	●
21 - 40	En riesgo	●
0 - 20	Aceptable	●
más de 61	Fallo en la planeación	●


Acumulado al Periodo	Total
Aprobado	\$ -
Modificado	\$ 327,757.69
Devengado	\$ 327,757.69

Semáforo
A 0.00%
B 100.00%
Acceptable


Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado

B. Porcentaje de avance del Modificado contra el Devengado



Arq. Alberto Kanek Zagal González
Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas



Arq. Alberto Gutiérrez Limón
Coordinador Técnico de la Secretaría de
Desarrollo Urbano y Obras Públicas

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

OP140

Construcción de drenaje sanitario en calles de las Maquinas, callejon del Campo, Lucy, Arenera, calle sin nombre y avenida de la Estación

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ 4,490,014.11	\$ -	\$ -
Devengado	\$ 2,006,242.05	\$ -	\$ 2,483,772.06

1er Trim
\$ -
\$ 4,490,014.11
\$ 4,490,014.11

Semáforo
A 0.00%
B 100.00%
Aceptable

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -

2do Trim
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo
A 0.00%
B 0.00%
Aceptable

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -

3er Trim
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo
A 0.00%
B 0.00%
Aceptable

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -

4to Trim
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo
A 0.00%
B 0.00%
Aceptable

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
41 - 60	Crítico	●
21 - 40	En riesgo	●
0 - 20	Aceptable	●
más de 61	Fallo en la planeación	●


Acumulado al Periodo	Total
Aprobado	\$ -
Modificado	\$ 4,490,014.11
Devengado	\$ 4,490,014.11


Semáforo
A 0.00%
B 100.00%
Aceptable

Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado

B. Porcentaje de avance del Modificado contra el Devengado


Arq. Alberto Kanek Zagal González
Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas


Arq. Alberto Gutiérrez Limón
Coordinador Técnico de la Secretaría de
Desarrollo Urbano y Obras Públicas

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

OP141

Construcción de red de drenaje sanitario en calles Pericos australianos, Bugambillas y Arquitectos de Sedesol

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ 188,561.75	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ 188,134.89	\$ 426.86

1er Trim
\$ -
\$ 188,561.75
\$ 188,561.75

Semáforo
A 0.00%
B 100.00%
Aceptable

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -

2do Trim
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo
A 0.00%
B 0.00%
Aceptable

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -

3er Trim
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo
A 0.00%
B 0.00%
Aceptable

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -

4to Trim
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo
A 0.00%
B 0.00%
Aceptable

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
41 - 60	Crítico	●
21 - 40	En riesgo	●
0 - 20	Aceptable	●
más de 61	Fallo en la planeación	●


Acumulado al Periodo	Total
Aprobado	\$ -
Modificado	\$ 188,561.75
Devengado	\$ 188,561.75

Semáforo
A 0.00%
B 100.00%
Aceptable


Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado

B. Porcentaje de avance del Modificado contra el Devengado



Arq. Alberto Kanek Zagal González
Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas



Arq. Alberto Gutiérrez Limón
Coordinador Técnico de la Secretaría de
Desarrollo Urbano y Obras Públicas

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

OP143

Construcción de drenaje sanitario en calle Gaviota, Golondrina y Codorniz

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	\$ -	\$ -	
Modificado	\$ 1,331,977.84	\$ -	
Devengado	\$ -	\$ 1,331,977.84	

1er Trim
\$ -
\$ 1,331,977.84
\$ 1,331,977.84

Semáforo
A 0.00%
B 100.00%
Aceptable

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -

2do Trim
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo
A 0.00%
B 0.00%
Aceptable

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -

3er Trim
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo
A 0.00%
B 0.00%
Aceptable

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -

4to Trim
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo
A 0.00%
B 0.00%
Aceptable

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
41 - 60	Crítico	●
21 - 40	En riesgo	●
0 - 20	Aceptable	●
más de 61	Fallo en la planeación	●

Acumulado al Periodo	Total
Aprobado	\$ -
Modificado	\$ 1,331,977.84
Devengado	\$ 1,331,977.84

Semáforo
A 0.00%
B 100.00%
Aceptable


Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado

B. Porcentaje de avance del Modificado contra el Devengado



Arq. Alberto Kanek Zagal González
Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

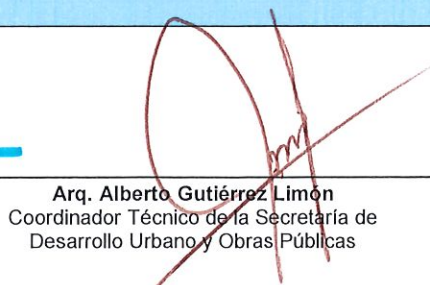

Arq. Alberto Gutiérrez Limón
Coordinador Técnico de la Secretaría de
Desarrollo Urbano y Obras Públicas

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

OP144

Construcción del drenaje sanitario en la calle Francisco Villa

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ 84,291.30	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ 84,224.84	\$ 66.46

1er Trim
\$ -
\$ 84,291.30
\$ 84,291.30

Semáforo	
A	0.00%
B	100.00%
Acceptable	

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -

2do Trim
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo	
A	0.00%
B	0.00%
Acceptable	

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -

3er Trim
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo	
A	0.00%
B	0.00%
Acceptable	

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -

4to Trim
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo	
A	0.00%
B	0.00%
Acceptable	

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
41 - 60	Crítico	●
21 - 40	En riesgo	●
0 - 20	Aceptable	●
más de 61	Fallo en la planeación	●

Acumulado al Periodo	Total
Aprobado	\$ -
Modificado	\$ 84,291.30
Devengado	\$ 84,291.30

Semáforo	
A	0.00%
B	100.00%
Acceptable	

Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado

B. Porcentaje de avance del Modificado contra el Devengado

Arq. Alberto Kanek Zagal González
Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

Arq. Alberto Gutiérrez Limón
Coordinador Técnico de la Secretaría de
Desarrollo Urbano y Obras Públicas

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

OP145

Construcción de pavimento de concreto hidráulico en calle adelfa

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ 794,637.17	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ 793,226.05	\$ 1,411.12

1er Trim
\$ -
\$ 794,637.17
\$ 794,637.17

Semáforo
A 0.00%
B 100.00%
Acceptable

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -

2do Trim
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo
A 0.00%
B 0.00%
Acceptable

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -

3er Trim
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo
A 0.00%
B 0.00%
Acceptable

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -

4to Trim
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo
A 0.00%
B 0.00%
Acceptable

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
41 - 60	Crítico	●
21 - 40	En riesgo	●
0 - 20	Aceptable	●
más de 61	Fallo en la planeación	●

Acumulado al Periodo	Total
Aprobado	\$ -
Modificado	\$ 794,637.17
Devengado	\$ 794,637.17

Semáforo
A 0.00%
B 100.00%
Acceptable

Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado

B. Porcentaje de avance del Modificado contra el Devengado

Arq. Alberto Kanek Zagal González
Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

Arq. Alberto Gutiérrez Limón
Coordinador Técnico de la Secretaría de
Desarrollo Urbano y Obras Públicas

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

OP146

Construcción de pavimento de concreto hidráulico en calle Defensa Nacional Primera Etapa

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ 2,787,224.77	\$ -	\$ -
Devengado	\$ 1,662,198.48	\$ -	\$ 1,125,026.29

1er Trim
\$ -
\$ 2,787,224.77
\$ 2,787,224.77

Semáforo		
A	0.00%	Aceptable
B	100.00%	

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -

2do Trim
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo		
A	0.00%	Aceptable
B	0.00%	

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -

3er Trim
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo	
A	0.00% Aceptable
B	0.00%

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -

4to Trim
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo		
A	0.00%	Aceptable
B	0.00%	

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
41 - 60	Crítico	●
21 - 40	En riesgo	●
0 - 20	Aceptable	●
más de 61	Fallo en la planeación	●


Acumulado al Periodo	Total
Aprobado	\$ -
Modificado	\$ 2,787,224.77
Devengado	\$ 2,787,224.77


Semáforo	
A	0.00%
B	100.00%

Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado

B. Porcentaje de avance del Modificado contra el Devengado


Arq. Alberto Kanek Zagal González
Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas


Arq. Alberto Gutiérrez Limón
Coordinador Técnico de la Secretaría de
Desarrollo Urbano y Obras Públicas

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

OP147

Equipamiento de sistema fotovoltaico para generación de energía interconectado a la red de CFE para el pozo de agua potable de miloillas

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ 4,658,293.51	\$ -	\$ -
Devengado	\$ 2,316,945.49	\$ -	\$ 2,341,348.02

1er Trim
\$ -
\$ 4,658,293.51
\$ 4,658,293.51

Semáforo		
A	0.00%	Aceptable
B	100.00%	

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -

2do Trim
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo		
A	0.00%	Aceptable
B	0.00%	

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -

3er Trim
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo		
A	0.00%	Aceptable
B	0.00%	

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -

4to Trim
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo	
A	0.00%
B	0.00%

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
41 - 60	Crítico	●
21 - 40	En riesgo	●
0 - 20	Aceptable	●
más de 61	Fallo en la planeación	●

Acumulado al Periodo	Total
Aprobado	\$ -
Modificado	\$ 4,658,293.51
Devengado	\$ 4,658,293.51

Semáforo	
A	0.00%
B	100.00%

Comentarios:

- A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado
- B. Porcentaje de avance del Modificado contra el Devengado

Arq. Alberto Kanek Zagal González
Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

Arq. Alberto Gutiérrez Limón
Coordinador Técnico de la Secretaría de
Desarrollo Urbano y Obras Públicas

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

OP148

Mejoramiento de baños de la escuela primaria Emiliano Zapata

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ 296,529.28	\$ -	\$ -
Devengado	\$ 239,336.37	\$ 56,895.39	\$ 297.52

1er Trim
\$ -
\$ 296,529.28
\$ 296,529.28

Semáforo
A 0.00%
B 100.00%
Acceptable

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -

2do Trim
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo
A 0.00%
B 0.00%
Acceptable

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -

3er Trim
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo
A 0.00%
B 0.00%
Acceptable

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -

4to Trim
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo
A 0.00%
B 0.00%
Acceptable

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
41 - 60	Crítico	●
21 - 40	En riesgo	●
0 - 20	Aceptable	●
más de 61	Fallo en la planeación	●

Acumulado al Periodo	Total
Aprobado	\$ -
Modificado	\$ 296,529.28
Devengado	\$ 296,529.28

Semáforo
A 0.00%
B 100.00%
Acceptable

Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado

B. Porcentaje de avance del Modificado contra el Devengado

Arq. Alberto Kanek Zagal González
Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

Arq. Alberto Gutiérrez Limón
Coordinador Técnico de la Secretaría de
Desarrollo Urbano y Obras Públicas

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

OP149

Construcción de empedrado en la calle José María Morelos y Pavón

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ 357,953.53	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ 329,860.58	\$ 28,092.95

1er Trim
\$ -
\$ 357,953.53
\$ 357,953.53

Semáforo
A 0.00%
B 100.00%
Acceptable

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -

2do Trim
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo
A 0.00%
B 0.00%
Acceptable

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -

3er Trim
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo
A 0.00%
B 0.00%
Acceptable

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -

4to Trim
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo
A 0.00%
B 0.00%
Acceptable

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
41 - 60	Crítico	●
21 - 40	En riesgo	●
0 - 20	Aceptable	●
más de 61	Fallo en la planeación	●

Acumulado al Periodo	Total
Aprobado	\$ -
Modificado	\$ 357,953.53
Devengado	\$ 357,953.53

Semáforo
A 0.00%
B 100.00%
Acceptable


Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado

B. Porcentaje de avance del Modificado contra el Devengado



Arq. Alberto Kanek Zagal González
Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas



Arq. Alberto Gutiérrez Limón
Coordinador Técnico de la Secretaría de
Desarrollo Urbano y Obras Públicas

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

OP150

Construcción de baños de la Escuela Primaria profr. Aurelio C. Merino

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	\$ -	\$ -	
Modificado	\$ 128,729.51	\$ -	
Devengado	\$ -	\$ 128,729.51	

1er Trim
\$ -
\$ 128,729.51
\$ 128,729.51

Semáforo
A 0.00%
B 100.00%
Acceptable

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -

2do Trim
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo
A 0.00%
B 0.00%
Acceptable

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -

3er Trim
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo
A 0.00%
B 0.00%
Acceptable

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -

4to Trim
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo
A 0.00%
B 0.00%
Acceptable


Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
41 - 60	Crítico	●
21 - 40	En riesgo	●
0 - 20	Aceptable	●
más de 61	Fallo en la planeación	●

Acumulado al Periodo	Total
Aprobado	\$ -
Modificado	\$ 128,729.51
Devengado	\$ 128,729.51


Semáforo
A 0.00%
B 100.00%
Acceptable

Comentarios:

- A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado
- B. Porcentaje de avance del Modificado contra el Devengado



Arq. Alberto Kanek Zagal González
Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas



Arq. Alberto Gutiérrez Limón
Coordinador Técnico de la Secretaría de
Desarrollo Urbano y Obras Públicas

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

OP151

Mejoramiento de los Baños de la Escuela Primaria Urbana Federal Gral. Lázaro Cárdenas

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ 219,126.69	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ 217,656.62	\$ 1,470.07

1er Trim
\$ -
\$ 219,126.69
\$ 219,126.69

Semáforo
A 0.00%
B 100.00%
Acceptable

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -

2do Trim
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo
A 0.00%
B 0.00%
Acceptable

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -

3er Trim
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo
A 0.00%
B 0.00%
Acceptable

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -

4to Trim
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo
A 0.00%
B 0.00%
Acceptable

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
41 - 60	Crítico	●
21 - 40	En riesgo	●
0 - 20	Acceptable	●
más de 61	Fallo en la planeación	●

Acumulado al Periodo	Total
Aprobado	\$ -
Modificado	\$ 219,126.69
Devengado	\$ 219,126.69

Semáforo
A 0.00%
B 100.00%
Acceptable

Comentarios:

- A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado
- B. Porcentaje de avance del Modificado contra el Devengado

Arq. Alberto Kanek Zagal González
Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

Arq. Alberto Gutiérrez Limón
Coordinador Técnico de la Secretaría de
Desarrollo Urbano y Obras Públicas

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

OP152

Construcción del puente Lomas Tetela

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ 8,998,050.00	\$ -	\$ -
Devengado	\$ 4,078,239.17	\$ 2,837,651.94	\$ 1,076,426.28

1er Trim
\$ -
\$ 8,998,050.00
\$ 7,992,317.39

Semáforo
A 0.00%
B 88.82%
Aceptable

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ 1,005,732.61	\$ -	\$ -

2do Trim
\$ -
\$ -
\$ 1,005,732.61

Semáforo
A 0.00%
B 0.00%
Aceptable

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -

3er Trim
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo
A 0.00%
B 0.00%
Aceptable

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -

4to Trim
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo
A 0.00%
B 0.00%
Aceptable

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
41 - 60	Crítico	●
21 - 40	En riesgo	●
0 - 20	Aceptable	●
más de 61	Fallo en la planeación	●

Acumulado al Periodo	Total
Aprobado	\$ -
Modificado	\$ 8,998,050.00
Devengado	\$ 8,998,050.00


Semáforo
A 0.00%
B 100.00%
Aceptable

Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado

B. Porcentaje de avance del Modificado contra el Devengado


Arq. Alberto Kanek Zagal González
Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas


Arq. Alberto Gutiérrez Limón
Coordinador Técnico de la Secretaría de
Desarrollo Urbano y Obras Públicas

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

OP153

Suministro y Rehabilitación de Espacio Comercial en avenida Central

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ 2,979,267.34	\$ -	\$ -
Devengado	\$ 621,208.13	\$ 1,836,354.41	\$ 521,704.80

1er Trim
\$ -
\$ 2,979,267.34
\$ 2,979,267.34

Semáforo
A 0.00%
B 100.00%
Acceptable

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -

2do Trim
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo
A 0.00%
B 0.00%
Acceptable

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -

3er Trim
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo
A 0.00%
B 0.00%
Acceptable

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -

4to Trim
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo
A 0.00%
B 0.00%
Acceptable

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
41 - 60	Crítico	●
21 - 40	En riesgo	●
0 - 20	Aceptable	●
más de 61	Fallo en la planeación	●

Acumulado al Periodo	Total
Aprobado	\$ -
Modificado	\$ 2,979,267.34
Devengado	\$ 2,979,267.34

Semáforo
A 0.00%
B 100.00%
Acceptable

Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado

B. Porcentaje de avance del Modificado contra el Devengado

Arq. Alberto Kanek Zagal González
Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

Arq. Alberto Gutiérrez Limón
Coordinador Técnico de la Secretaría de
Desarrollo Urbano y Obras Públicas

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

OP158

Construcción de Protección peatonal del Puente Amanalco

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ 463,878.48	\$ -	\$ -
Devengado	\$ 463,878.48	\$ -	\$ -

1er Trim
\$ -
\$ 463,878.48
\$ 463,878.48

Semáforo
A 0.00%
B 100.00%
Acceptable

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -

2do Trim
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo
A 0.00%
B 0.00%
Acceptable

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -

3er Trim
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo
A 0.00%
B 0.00%
Acceptable

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -

4to Trim
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo
A 0.00%
B 0.00%
Acceptable

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
41 - 60	Crítico	●
21 - 40	En riesgo	●
0 - 20	Acceptable	●
más de 61	Fallo en la planeación	●

Acumulado al Periodo	Total
Aprobado	\$ -
Modificado	\$ 463,878.48
Devengado	\$ 463,878.48

Semáforo
A 0.00%
B 100.00%
Acceptable


Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado

B. Porcentaje de avance del Modificado contra el Devengado



Arq. Alberto Kanek Zagal González
Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas



Arq. Alberto Gutiérrez Limón
Coordinador Técnico de la Secretaría de
Desarrollo Urbano y Obras Públicas

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

OP159

Balizamiento de avenida Morelos Primera etapa el tramo comprende de chipitlan hasta la calle amates 2.51 KM

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ 299,920.32	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ 299,920.32	\$ -

1er Trim
\$ -
\$ 299,920.32
\$ 299,920.32

Semáforo
A 0.00%
B 100.00%
Acceptable

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -

2do Trim
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo
A 0.00%
B 0.00%
Acceptable

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -

3er Trim
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo
A 0.00%
B 0.00%
Acceptable

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -

4to Trim
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo
A 0.00%
B 0.00%
Acceptable

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
41 - 60	Crítico	●
21 - 40	En riesgo	●
0 - 20	Aceptable	●
más de 61	Fallo en la planeación	●


Acumulado al Periodo	Total
Aprobado	\$ -
Modificado	\$ 299,920.32
Devengado	\$ 299,920.32

Semáforo
A 0.00%
B 100.00%
Acceptable

Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado

B. Porcentaje de avance del Modificado contra el Devengado


Arq. Alberto Kanek Zagal González
Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas


Arq. Alberto Gutiérrez Limón
Coordinador Técnico de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas
